

RAPORT Z MONITORINGU ZA ROK 2022 PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA LATA 2017-2023



Opracowanie:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel.: +48 85 869 61 19
e-mail: dsr@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

Białystok, maj 2023 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023	5
2.1. Diagnoza.....	5
2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji	6
2.3. Cele strategiczne i operacyjne	8
3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2022 r.).....	9
3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne.....	9
3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne.....	22
3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2022.....	30
4. Monitoring założonych wskaźników	31
5. Spis tabel i rysunków.....	32

1. Wstęp

Przedstawiony raport jest monitoringiem *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* przyjętego Uchwałą Nr XLIX/750/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W 2018 roku *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* został pozytywnie zaopiniowany w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (uchwała Nr 299/4242/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.).

W 2021 roku została przeprowadzona ewaluacja po trzech latach od wdrożenia „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Raport z ewaluacji jest dostępny na stronie internetowej Miasta Białystok www.bialystok.pl w zakładce *Dla Mieszkańców – Rewitalizacja - Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023*.

Raport prezentuje dane za rok 2022 (według stanu na dzień 31.12.2022 r.). Część opisująca stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych została opracowana na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców i realizatorów projektów rewitalizacyjnych.

2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

2.1. Diagnoza

Na potrzeby opracowania *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* przeprowadzono diagnozę całego miasta pod kątem różnorodnych wskaźników (dane za rok 2015). W badanym okresie Białystok był zamieszkały przez 275 513 osób zameldowanych na pobyt stały. Powierzchnia miasta od 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi ok. 102 km². Badanie obejmowało pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną na podstawie, których zostały wyznaczone: obszary zdegradowany i rewitalizacji o koncentracji zjawisk kryzysowych na poziomie wyraźnie przekraczającym wartość dla całego miasta.

Sfera społeczna

Sytuacja społeczna Białegostoku została zbadana na podstawie następujących grup wskaźników: korzystający z pomocy społecznej, przestępczość, edukacja, seniorzy, bezrobocie, aktywność mieszkańców, bezdomność (łącznie 25 wskaźników). Największą liczbę wskaźników w sposób negatywnie odbiegających od średniej dla miasta zidentyfikowano w przypadku 12 osiedli (Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Przydworcowe, Młodych, Dziesięciny I, Dziesięciny II oraz Piaski).

Sfera gospodarcza

Analizując liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców osiedla, największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej stwierdzono na 17 osiedlach (Białostoczek, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Piasta, Skorupy, Mickiewicza, Bema, Zielone Wzgórza, Starosielce, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki i Dojlidy Górne).

Sfera środowiskowa

Na podstawie wskaźników: niedobór terenów zielonych na obszarze miasta, stężenia poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z emisji łącznej w strefie aglomeracji białostockiej oraz powierzchni miejsc występowania wyrobów azbestowych w przeliczeniu na km², osiedla wyznaczono obszary problemowe na 7 osiedlach (Przydworcowe, Piasta, Piasta II, Skorupy, Bema, Kawaleryjskie, Starosielce).

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W ramach określenia obszarów zdegradowanych pod względem sfery przestrzenno-funkcjonalnej posłużono się siedmioma wskaźnikami: średnią liczbą osób korzystających z komunikacji publicznej w przeliczeniu na jeden przystanek, liczbą instytucji kultury na km² powierzchni, liczbą obiektów sportowych na km² powierzchni, liczbą placówek opieki zdrowotnej na km² powierzchni, gęstością zaludnienia [os./km²], niedoborem infrastruktury technicznej oraz żłobków. Wskaźniki przekraczające średnią wartość dla całego miasta zaobserwowano na 16 osiedlach (Białostoczek, Młodych, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Skorupy, Dojlidy, Bema, Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Starosielce, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Bacieczki, Zawady, Dojlidy Górne).

Sfera techniczna

Analizując liczbę budynków niskoemisyjnych na km², liczbę komunalnych budynków mieszkalnych w Białymstoku niewyposażonych w centralne ogrzewanie i liczbę budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem na km², stwierdzono największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze technicznej na 12 osiedlach (Centrum, Sienkiewicza, Piaski, Przydworcowe, Antoniuk, Jaroszkówka, Piasta II, Skorupy, Mickiewicza, Dojlidy, Kawaleryjskie, Dziesięciny II).

2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Na podstawie diagnozy wyodrębniono te części miasta, w których ilość stwierdzonych problemów społecznych była wyższa od średniej wartości dla miasta oraz zaobserwowano problemy w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje 12 osiedli: Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Młodych, Przydworcowe, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Piaski.


Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z powyższymi kryteriami obejmuje obszar:

- o powierzchni 19,8 km² (19,4% powierzchni Białegostoku),
- zamieszkały przez 81 209 osoby (29,5% mieszkańców Białegostoku).

Obszar rewitalizacji obejmuje 9 osiedli położonych w trzech podobszarach rewitalizacji:

- Podobszar I (osiedla: Przydworcowe, Centrum, Antoniuk, Bema, Sienkiewiczza, Dziesięciny I),
- Podobszar II (osiedla: Skorupy, Dojlidy),
- Podobszar III (osiedle Starosielce).

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji

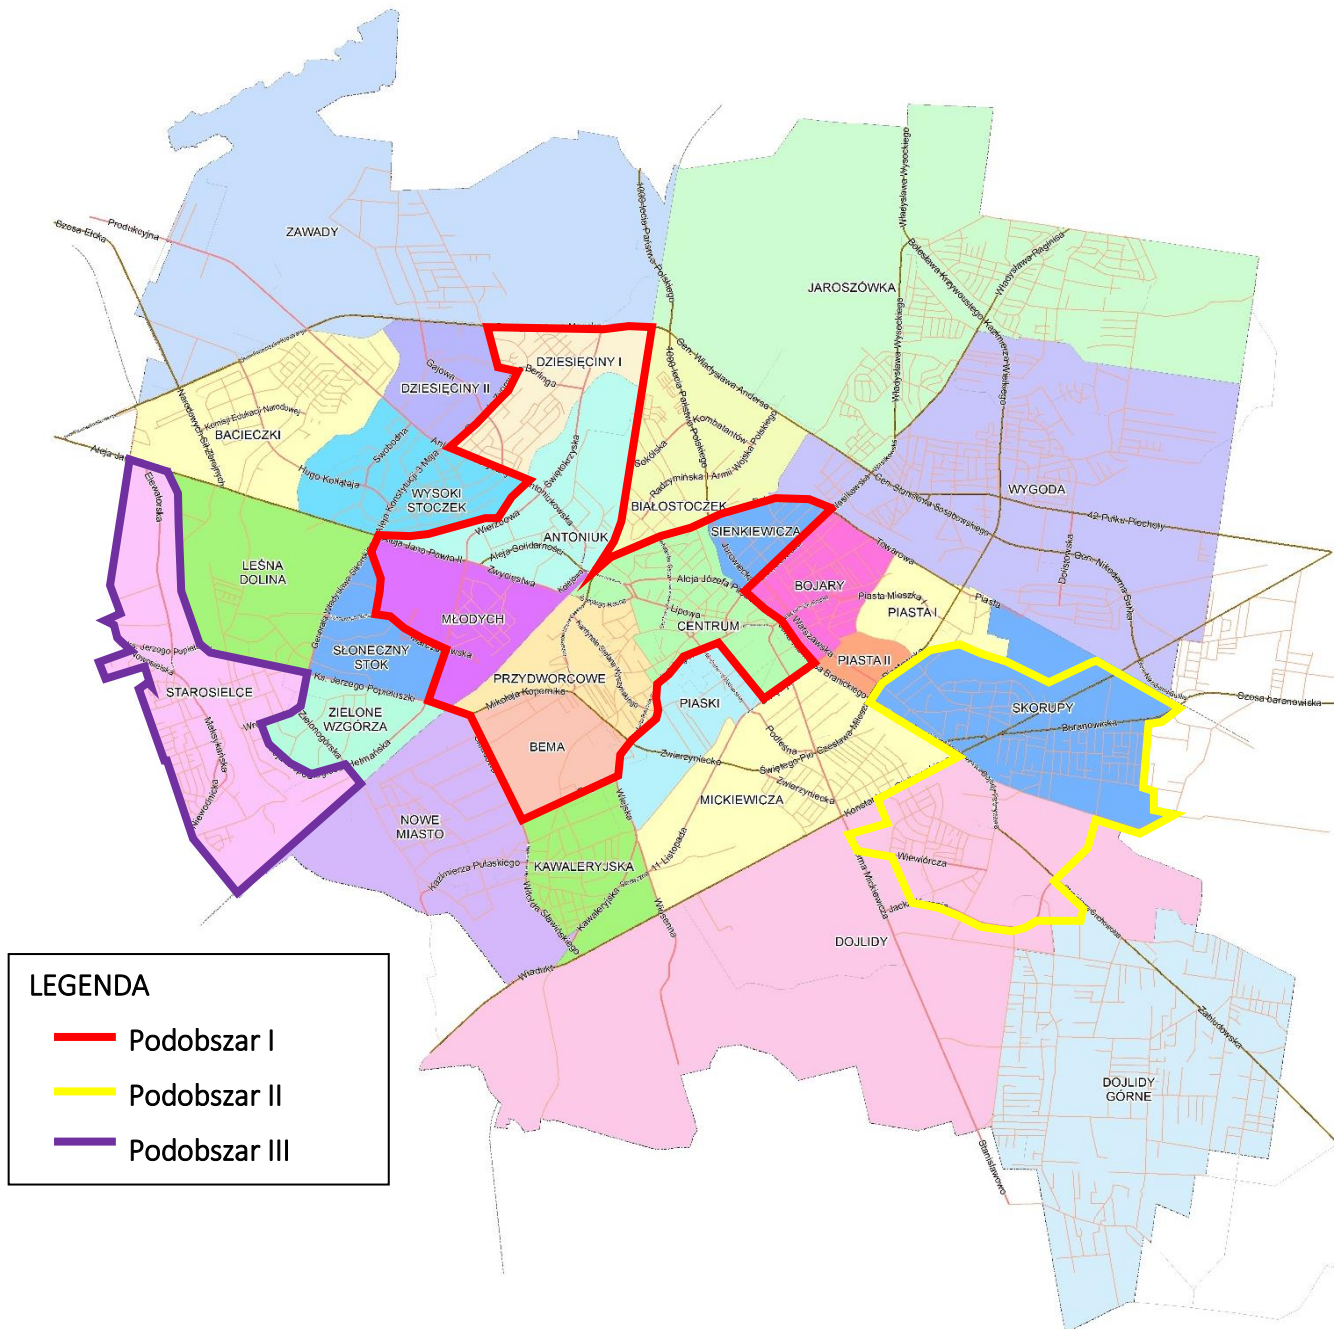

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Cele strategiczne i operacyjne

Cele Programu rewitalizacji opracowano w oparciu o zdiagnozowane problemy. W efekcie sformułowane zostały poniższe cele strategiczne i operacyjne.

Cel strategiczny 1. Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel operacyjny 1.1. Silne więzi społeczne i wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta

Cel operacyjny 1.2. Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców

Cel operacyjny 1.3. Zwiększona dostępność do usług społecznych dla mieszkańców

Cel operacyjny 1.4. Wysoka jakość i dostępność opieki nad dziećmi oraz oświaty i edukacji

Cel operacyjny 1.5. Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa w mieście

Cel strategiczny 2. Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji

Cel operacyjny 2.1. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców

Cel operacyjny 2.2. Wysoki poziom dostępności do usług dla mieszkańców

Cel operacyjny 2.3. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej obszarów

Cel strategiczny 3. Zapewnione wysokiej jakości warunki życia mieszkańców

Cel operacyjny 3.1. Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz działających organizacji pozarządowych

Cel operacyjny 3.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej zdegradowanych obszarów miasta

Cel operacyjny 3.3. Atrakcyjna przestrzeń publiczna służąca wszystkim aktorom miasta

Cel operacyjny 3.4. Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel operacyjny 3.5. Wysoki poziom środowiskowych walorów życia mieszkańców

3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2022 r.)

Aktualnie obowiązujący Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 zawiera 43 projekty podstawowe o łącznej szacunkowej wartości 278 430 850,00 zł. W programie jest 11 grup przedsięwzięć uzupełniających oraz 13 projektów uzupełniających, których łączna szacunkowa wartość realizacji wynosi 98 040 000,00 złotych.

3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z rozbudową budynku gospodarczego i nowym zagospodarowaniem terenu UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt został zrealizowany w 2021 r.	-----	-----	4 027 566,67 (środki własne)	-----
2.	Remont i modernizacja budynku przy ul. Ciepłej 4 UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt został zrealizowany w 2020 r.	-----	-----	3 602 336,76 (środki własne)	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
3.	Program zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Białej w Białymstoku realizowany etapami UM Departament Urbanistyki / UM Departament Inwestycji	Projekt jest planowany do realizacji.	Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki na rzece Białej łączącej ul. Jurowiecką z ul. Włókienniczą. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast druga oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Ogłoszono kolejne postępowanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej. Nie wpłynęła żadna oferta.	49 323,60 (środki własne – 49 323,60 zł w tym: środki niewygasające roku 2021 wydatkowane w 2022 roku – 47 748,60 zł, środki budżetu 2022 roku - 1 575,00 zł)	387 460,61 (środki własne – 387 460,61, w tym: 52 700,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 49 323,60 zł w tym: środki niewygasające roku 2021 wydatkowane w 2022 roku)	Budowa kładki na rzece Białej łączącej ul. Jurowiecką z ul. Włókienniczą. Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej - zadanie zgłoszono do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 jako część przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku”. W przypadku otrzymania dofinansowania planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
4.	Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na Osiedlu Bema w Białymstoku Rada Osiedla Bema / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt jest w trakcie realizacji.	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	0,00	201 474,00 (środki własne)	W 2023 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i ewentualne rozpoczęcie robót budowlanych.
5.	Białystok miastem wyciągającym dłoń do potrzebujących Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
6.	Nowa szansa na nowe życie w mieszkaniach treningowych dla osób bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
7.	Centrum Aktywności Lokalnej na Włókienniczej Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
8.	Aktywny Antoniuk Fundacja Laboro, Stowarzyszenie My dla Innych	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
9.	Dawna Misja Barbikańska centrum życia kulturalnego Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
10.	STAROTEKA - biblioteka multimedialna, formalnie filia biblioteczna Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
11.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku Dyrektor Szkoły / UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany.	Wykonanie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, piwnic, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, montaż drzwi aluminiowych oraz przegród aluminiowych, wykonanie elewacji, zamurowanie zbędnych okien, wymiana inst. c.o. i c.w.u. – wymiana grzejników, modernizacja oświetlenia, wymiana opraw na energooszczędne – 743 szt.) wraz z robotami towarzyszącymi.	694 582,35 (środki własne – 694 582,35 zł, środki niewygasające roku 2021 wydatkowane w 2022 roku)	5 399 894,30 (środki własne – 2 815 206,64 zł w tym: 694 600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., 1 990 000,00 zł (wydatki niewygasające roku 2020,	<u>Dodatkowe informacje:</u> Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
					Środki unijne – 2 584 687,66 zł)	
12.	Dom Sąsiedzki „Na Rocha” UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
13.	Dostosowanie budynku przy ulicy św. Rocha 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt jest w trakcie realizacji.	W 2022 r. w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3: • wykonano nowe oznaczenia kontrastowe na schodach wewnątrz budynku, • zamontowano dodatkowe tabliczki z opisem poszczególnych pomieszczeń z poddrukami w alfabecie Braille'a, • zakupiono specjalny papier na potrzeby wydruków w alfabecie Braille'a, • dwóch pracowników Centrum Aktywności Społecznej uczęszczało na kurs języka migowego.	520,15 (środki własne)	57 193,84 (środki własne Centrum Aktywności Społecznej – 39 554,84 zł, środki własne Centrum Usług Informatycznych – 17 639,00 zł)	Realizacja wirtualnego spaceru po budynku Centrum Aktywności Społecznej wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń przy zastosowaniu audiodeskrypcji i tłumaczenia na język migowy. Wykonanie oznaczeń kontrastowych na schodach zewnętrznych budynku.
14.	Budowa zbiornika retencyjnego zlewnia z ul. Bohaterów Monte Cassino – PKP – ul. Stofeczna UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest planowany do realizacji.	22.02.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane.	3 281 865,66 (środki unijne)	3 343 365,66 (środki własne – 11 500,00 zł, środki unijne – 3 331 865,66 zł)	Zakończenie robót budowlanych, w ramach których zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny planowane jest na II kwartał 2023 r. <u>Dodatkowe informacje:</u> Zbiornik retencyjny zostanie wybudowany w ramach realizacji umowy na rozbudowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej. Zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020 pn. „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny (centrum przesiadkowe

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
						wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)".
15.	Zielone podwórka w Centrum Białegostoku - modernizacja istniejących i zagospodarowanie nowych terenów zieleni urządzonej UM Departament Urbanistyki / UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest planowane do realizacji we wskazanym okresie czasowym.
16.	„Bądź najlepszy, bądź aktywny” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
17.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Antoniuk UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
18.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Dębowej i Cedrowej UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest planowany do realizacji.	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało 13.04.2022 r. unieważnione, gdyż złożona najniższa oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.	0,00	0,00	-----
19.	Klub Seniora UM Departament Spraw Społecznych	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	<u>Dodatkowe informacje:</u> W związku z brakiem dostępności lokali gminnych i możliwości finansowych budżetu Miasta projekt nie był realizowany.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
20.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 7 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2021 r.	-----	-----	1 961 841,08 (środki własne – 238 475,42 zł (środki niewygasające roku 2020), środki własne – 1 164 214,19, środki unijne – 559 151,47 zł)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
21.	„Aktywny Senior” – kawiarenka z salą rehabilitacyjną UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
22.	„Święto Sąsiadów” – coroczna impreza edukacyjno-kulturalna UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
23.	Budowa zbiornika retencyjnego – ul. Gen. J. Hallera / Świętokrzyska UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta.
24.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Gen. J. Hallera przy ogrodach działkowych UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta.
25.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55	Projekt jest w trakcie realizacji.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	-----	-----	W 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	UM Departament Inwestycji					
26.	Budowa zbiornika retencyjnego – zlewnia z ul. Korzeniowskiego przed ogrodami działkowymi UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta i nieplanowane do realizacji ze względu na brak dostępności terenu.
27.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Dojlidy UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
28.	„Sąsiedzka pomoc wzajemna” – mikroinicjatywa samopomocowa UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt został zrealizowany w 2018 r.	-----	-----	-----	-----
29.	„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
30.	„Historia Starosielc w Galerii Grafitti” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
31.	„Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Starosielc jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych.” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
32.	Klub osiedlowy „Razem” przy ul. Barszczańskiej 5 UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt został zrealizowany.	Miasto Białystok w procedurze konkursowej zleciło na 2022 rok realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych o nazwie: „Prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5” na kwotę 49 980 zł. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” w lokalu pod adresem ul. Barszczańska 5 w terminie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Począwszy od 2017 roku wymieniona inicjatywa jest realizowana jako efekt wniosku zgłoszonego przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2016. Zadanie polegało na prowadzeniu na osiedlu Starosielce klubu sąsiedzkiego dostępnego wszystkim mieszkańcom. Celem jego realizacji był rozwój społeczności lokalnych na osiedlu Starosielce i zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców, zapewnienie wsparcia mieszkańcom w rozwoju ich zainteresowań i realizacji inicjatyw służących wzmocnieniu więzi	49 980,00 (środki własne)	252 365,00 (środki własne)	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
			<p>lokalnych. Z potencjału Klubu mogli korzystać mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe. Realizacja działań w klubie sąsiedzkim odbywała się w oparciu o:</p> <p>a) opracowany wspólnie z mieszkańcami program działalności, dopasowany do ich potrzeb i oczekiwań wynikających z diagnozy, b) społeczne zaangażowanie mieszkańców – włączenie się mieszkańców w przygotowanie i wykonanie inicjatyw oraz ich ewaluację, c) promocję w środowisku lokalnym wydarzeń i inicjatyw realizowanych w klubie, d) współpracę z lokalnymi instytucjami, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Policja, szkoła, przedszkole, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.</p> <p>Klub był czynny przez 5 dni w tygodniu. W ramach działania klubu:</p> <p>a) odbywały się zajęcia tematyczne: kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze, decupage, krawieckie, informatyczne, b) działań kącik tematyczny „Zrób to sam”- mieszkańcy przy użyciu sprzętów technicznych i narzędzi dostępnych w Klubie mogli samodzielnie dokonywać drobnych napraw, c) funkcjonował „Kącik wymiany życzliwości sąsiedzkiej” – mieszkańcy mogli wymieniać się odzieżą, obuwiem, drobnymi akcesoriami</p>			

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
			wyposażenia mieszkania, d) prowadzono Punkt Informacji Obywatelskiej - na tablicy ogłoszeniowej publikowane były informacje dotyczące działań Miasta, Budżetu Obywatelskiego, aktywności organizacji pozarządowych, impres plenerowych. e) funkcjonowała grupa samopomocowa dzieci i młodzieży, w ramach której świadczona była wzajemna pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, f) wydawano żywność z Banku Żywności, g) prowadzono „Kącik biblioteczny”.			
33.	Budowa parku przy ul. Szkolnej UM Departament Gospodarki Komunalnej / Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
34.	Mini bazaraki osiedlowe i punkty wymiany towarów UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
35.	Podwórkowe Centrum Edukacji i Dialogu Społecznego – ławeczka UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
36.	Kulturalny Dom Spotkań UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
37.	Budowa kanalizacji deszczowej w obszarze rewitalizacji UM Departament Gospodarki	Projekt jest w trakcie realizacji.	Ul. Bohaterów Monte Cassino - 22.02.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Ul. Depowa - trwały roboty budowlane	11 030 523,5 (ul. Depowa - środki własne: 221 994,05 zł	13 352 703,95 (środki własne: 849 398,44 zł, środki unijne:	1. Ul. Bohaterów Monte Cassino – Zakończenie robót budowlanych, w ramach których zostanie wybudowana m.in. kanalizacja deszczowa, planowane

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich		związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej. 28.07.2023 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Ul. Fabryczna - 03.06.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. 11.08.2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Ul. Żurawia – 11.07.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Ul. Kolejowa i ul. Zwycięstwa - 28.12.2022 r. nastąpił odbiór końcowy robót, związany m.in. z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa i ul. Kolejowej w ramach umowy na „Zaprojektowanie i budowę przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP”.	- środki unijne: 544 078,15 zł Razem: 766 072,20 zł; ul. Fabryczna - środki własne: 156 608,67 zł; ul. Bohaterów Monte Cassino - środki własne: 100 769,87 zł - środki unijne: 6 900 316,62 zł Razem: 7 001 086,49 zł ul. Kolejowa, ul. Zwycięstwa - środki własne: 833 210,28 zł - środki unijne: 2 273 572,86 zł Razem: 3 106 783,14 zł)	11 190 749,64 zł)	jest na II kwartał 2023 r. 2. Ul. Żurawia - planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku, dotyczącego uzyskania decyzji ZRID w ramach, której zostanie wybudowana m.in. kanalizacja deszczowa. <u>Dodatkowe informacje:</u> 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterów Monte Cassino, Zwycięstwa i ul. Kolejowej ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.
38.	Instalowanie źródeł energii odnawialnej, w szczególności źródeł solarnych (ciepłych i fotowoltaicznych) na obiektach użyteczności publicznej oraz	Projekt został zrealizowany w 2021 r.	-----	-----	6 427 011,22 (środki własne – 2 822 001,02 zł, środki unijne – 3 066 282,90 zł,	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji na terenie miasta Białystok UM Departament Ochrony Środowiska				inne - wpłaty mieszkańców: 538 727,30 zł)	
39.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Mieście Białystok UM Departament Edukacji	Projekt został zrealizowany w 2020 r.	-----	-----	-----	-----
40.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Zadanie nie jest planowane do realizacji we wskazanym okresie czasowym.
41.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----
42.	Rewitalizacja osiedli poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców - monitoring wizyjny UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt został zrealizowany.	Zamontowano kamery monitoringu wizyjnego w poniższych lokalizacjach: 1. Rondo na skrzyżowaniu ul. Transportowej i Alei I. J. Paderewskiego; 2. Rondo na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Alei Niepodległości; 3. Rondo na skrzyżowaniu ul. Ks. J. Popiełuszki i Alei Niepodległości; 4. Rondo na skrzyżowaniu ul. Gen. F. Kleeberga i Narodowych Sił Zbrojnych; 5. ul. Gen. F. Kleeberga na istniejącym maszcie znaku zmiennej treści.	1 097 894,34 (środki własne)	1 292 864,03 (środki własne)	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
43.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 42 UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2020 r.	-----	-----	-----	-----

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych.

3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne

Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
12.	<p>Przebudowa budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowanie fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku</p> <p>UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Arsenał, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu</p>	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	<p>Projekt rewitalizacji nie został rozpoczęty, nie jest planowany zakres rzeczowy w ramach projektu na lata 2023/2024. Będą kontynuowane prace remontowe w ramach działań bieżących.</p> <p><u>Dodatkowe informacje:</u> Ponoszone przez Galerię Arsenał nakłady na budynek starej elektrowni są nakładami w ramach bieżącej działalności instytucji. Niedokończona procedura pozyskania przez Miasto Białystok od PGE działek nr 1780/14 i 1780/15 w obr. 11 uniemożliwia podjęcie dalszych działań zmierzających do kompleksowej przebudowy budynku starej elektrowni, m.in. uniemożliwione jest zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, w ramach projektu rewitalizacyjnego. Posiadana przez Galerię Arsenał dokumentacja projektowa jest niekompletna i nieaktualna. Galeria nie zakończyła więc opracowywania dokumentacji do adaptacji budynku wg projektu rewitalizacyjnego i nie aktualizowała dokumentacji już opracowanej; nie ma też na to środków finansowych. Galeria, żeby prowadzić w obiekcie działania statutowe, musi stale wykonywać bieżące naprawy i ulepszenia, gdyż budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace taką metodą są realizowane od 2018 r. W ramach robót tymczasowych Galeria w 2018 r. wykonała remont dachu ze środków z budżetu Miasta.</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
						<p>W 2020 r., zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, zdemontowano i zutylizowano starą podłogę.</p> <p>W 2021 r. zrealizowano kolejny etap prac, umożliwiających prowadzenie działalności, polegający na: wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych tj. wyburzenie ścian działowych i nośnych w piwnicy, i na parterze, rozbiórka podłóg oraz elementów konstrukcji antresoli w obiekcie na pow. 1 564,5 m². Zutylizowano materiał rozbiórkowy: gruz, złom oraz gruz zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi z terenu rozbiórki. Opracowano dokumentację projektową i kosztorys nowego przyłącza energii elektrycznej, podstawowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Prace w 2021 r. były finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i środków Galerii i wyniosły 195 370 zł. Galeria zrealizowała je w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Galerii Arsenał w Białymstoku.</p> <p>W 2022 r. Galeria kontynuowała prace w budynku. Wykonano stropy, wylano betonową podłogę, wykonano wiatrołap, ścianę p. pożarową, ścianki ekspozycyjne w budynku; przeprowadzono prace sanitarne; wykonano toaletę; wykonano nową instalację elektryczną i teletechniczną; wyożonowano pomieszczenia. Budynek udostępniono odbiorcom w październiku 2022 r. Prace w 2022 r. były finansowane z dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku wyniosły 1 600 618 zł. Galeria zrealizowała je w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych i</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
						na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Galerii Arsenał w Białymstoku. Prace przeprowadzone w 2022 r. nie są jednak pracami w ramach planowanego projektu rewitalizacji, zostały przeprowadzone, by umożliwić prowadzenie w budynku podstawowej działalności. W 2023 r. będą one kontynuowane.
13.	BTL - przestrzeń kreatywna UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Białostocki Teatr Lalek, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu	Projekt jest planowany do realizacji.	W 2022 roku projekt nie był realizowany (nie pozyskano środków na jego realizację).	-----	-----	<u>Dodatkowe informacje:</u> Na podstawie wykonanej dokumentacji będzie możliwa modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury o salę widowiskową na 100 osób wraz z niezbędnym zapleczem. Realizacja jest jednak zależna od środków, możliwych do uzyskania z budżetu Miasta Białostok i innych źródeł. W 2023 i 2024 roku BTL będzie czynił starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji.
14.	Adaptacja zabytkowego obiektu na cele kultury - siedzibę domu kultury „ŚRÓDMIEŚCIE” UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Dom Kultury „Śródmieście”, Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	60,60 (środki własne)	<u>Dodatkowe informacje:</u> Do Zarządu Mienia Komunalnego w dn. 08.04.2022 r. wpłynęła informacja z Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku podpisana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zbigniewa Nikitorowicza o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego części nieruchomości zabudowanej przy ul. Lipowej 41D oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb 11 – jako działka nr 1605/2 o pow. 0,2490ha. Mając powyższe na uwadze, z dniem 20 maja 2022 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku rozwiązał na mocy porozumienia stron umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb w/w budynku.
15.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowego obiektu na siedzibę Galerii im. Sleńdzińskich	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	Projekt rewitalizacji nie został rozpoczęty. W latach 2023/2024 będą kontynuowane prace remontowe w ramach działań bieżących.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Sleńdzińskich, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu					<p><u>Dodatkowe informacje:</u> Galeria nie opracowała całościowego projektu dokumentacji dotyczącej kompleksowej adaptacji i rozbudowy budynku, zgodnie z Programem i nie ma na to środków. Ponoszone przez Galerię im. Sleńdzińskich nakłady na budynek są ponoszone w ramach bieżącej działalności (jako remont, od 2022 r. jako inwestycja) i dostosowywania obiektu do rozpoczęcia w nim działalności podstawowej. Galeria realizuje remonty i prowadzi prace oraz przygotowuje dokumentację etapowo, do każdego rodzaju niezbędnych prac, by dostosować obiekt do potrzeb instytucji, w miarę posiadanych środków, z dotacji z budżetu miasta. W 2021 r. kontynuowano prace remontowe, rozpoczęte w latach poprzednich, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację węzła cieplnego, - wymianę instalacji c.o., - remont łazienki z wymianą instalacji sanitarnej, - posadzkę na parterze, - projekt przebudowy pomieszczeń piwnicy z budową schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) i projektem zagospodarowania działki (utwardzenia i zieleni). <p>Nakłady ww. prace wyniosły 584 755,71 zł; środki pochodziły z budżetu miasta Białystok. Prace wykonywano w systemie gospodarczym oraz stosując regulamin udzielania zamówień publicznych Galerii im. Sleńdzińskich (przy wyborze wykonawców z zakresu wymiany instalacji sanitarnej i c.o. oraz wykonania projektów). Po zakończeniu w pierwszym kwartale 2022 r. prac na parterze obiektu Galeria wznowiła działalność w tej części budynku, prezentując kolekcję Śleńdzińskich.</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
						Ponadto na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji technicznej Galeria w 2022 r. rozpoczęła prace remontowe w zakresie piwnicy obiektu i zagospodarowania działki - terenu przy budynku. Zrealizowano I etap, tj. część prac przy uszczelnieniu piwnic obiektu, wykonano roboty elektryczne w piwnicy; wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej; rozpoczęto prace terenowe przy budynku (m.in. karczowanie pni, rozbiórka nawierzchni, wyburzenie wiat). Poniesione nakłady - 300 000 zł (z dotacji z budżetu miasta). W 2023 r. prace w ww. zakresie będą kontynuowane jako II etap. Prace prowadzono stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Prace rozpoczęte i wykonane w 2022 r. nie są jednak pracami w ramach projektu adaptacji i rozbudowy obiektu. Prowadzone są jako kolejny etap remontu umożliwiającego prowadzenie w budynku działalności instytucji. Będą one kontynuowane etapowo w kolejnych latach.
16.	Rewaloryzacja Parku Lubomirskich w Białymstoku UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	66 420,00 (środki własne)	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. <u>Dodatkowe informacje:</u> W 2022 r. w projekcie budżetu na 2023 r. pozycja dot. realizacji zadania została z przyczyn niezależnych od DGK wykreślona. Z uwagi na brak środków zadanie nie było realizowane. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17.	Usprawnienie połączenia pomiędzy osiedlami Centrum i Białostoczek	Projekt został zrealizowany w 2021 r.	-----	-----	81 703 064,65 (rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	UM Zarząd Dróg Miejskich				Polskiego – środki własne – 32 323 111,19 zł, środki unijne: 3 709 740,00 zł; rozbudowa ul. Jurowieckiej (2018 r.- 2019 r.) środki własne – 3 999 832,10 zł; środki unijne– 6 941 569,95 zł; budowa ul. Bł. Ks. M. Sopoćki (2017 r.- 2018 r.) – środki własne – 2 407 265,96 zł, środki unijne – 32 321 545,45 zł)	
18.	Przewóz Osób Niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym. Zwiększenie dostępności przez osoby niepełnosprawne do przewozów UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	Projekt jest w trakcie realizacji.	W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę fabrycznie nowego mikrobusu wyposażonego w windę do załadunku osoby na wózku inwalidzkim. Dostawa zgodnie z umową nastąpi do dnia 23 marca 2023 r. w cenie 334 191 zł.	-----	-----	W budżecie roku 2023 nie zagwarantowano środków finansowych na zakup mikrobusu.
19.	Przyjazne, wygodne i zielone otoczenie przystanków komunikacji miejskiej UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej / UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt został zrealizowany w 2019 r.	-----	-----	-----	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
20.	Budowa żłobka na osiedlu Wygoda UM Departament Inwestycji	Projekt został zrealizowany w 2021 r.	-----	-----	9 752 450,13 (środki własne – 5 952 450,13 zł środki budżetu państwa – 3 800 000,00 zł)	-----
21.	Likwidacja barier infrastrukturalnych kolidujących z docelowym przeznaczeniem terenu UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----
22.	Budowa zbiorników retencyjnych poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	1. Zbiornik retencyjny na Krywlanach - 10.08.2022 r. nastąpił odbiór ostateczny inwestycji. W ramach zadania wykonano: - zbiornik retencyjny o pojemności 6 964,00 m ³ . - kanalizację deszczową - drogę dojazdową do zbiornika 450 m. 2. Budowa ulicy Sielskiej i Rodzinnej - 09.08.2022 r. uzyskano decyzję ZRID - 13.12.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane.	6 590 235,69 (Zbiornik na Krywlanach: środki własne – 2 049 721,93 zł środki unijne – 4 540 513,76 zł)	8 346 192,36 (środki własne – 772 173,18 zł, dofinansowanie – 567 394,62 zł, zbiornik na Krywlanach: środki własne – 2 178 362,39 zł środki unijne – 4 828 262,17 zł)	1. Budowa zbiornika w ul. Rodzinna - Sielska - W 2023 r. planowane jest zakończenie inwestycji. <u>Dodatkowe informacje:</u> 1. Budowa zbiornika retencyjnego na Krywlanach ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020, pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”. 2. Budowa zbiornika w ul. Rodzinna - Sielska ujęta jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020, pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”. 3. Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu nie są ujęte w budżecie miasta 2023.
23.	Budowa kanalizacji deszczowej – poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg	Projekt jest planowany do realizacji.	Ul. Bitwy Białostockiej dawniej I Armii Wojska Polskiego - W 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ul. Jagiellońska – 29.09.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie	-----	2 537 130,13 (środki własne – 60 324,20 zł; ul. Słoneczna – środki	Ul. Bitwy Białostockiej – Na przełomie II/III kwartału 2023 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID. Ul. Jagiellońska – W 2023 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2022 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2023/2024 Dodatkowe informacje
	Miejskich		dokumentacji projektowej.		własne – 166 078,53 zł; ul. Produkcyjna – dofinansowanie w ramach projektu " rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - POPW 2014-2020 – 1 776 812,00 zł; ul. Uroczą – środki własne – 533 915,40 zł)	
24.	Wykonanie utwardzenia stanowisk dla pojazdów oraz chodnika (osiedle Bema) Osoba fizyczna / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt nie był realizowany.	-----	-----	-----	-----

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych

3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2022

Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				SUMA
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany	
Projekty podstawowe	1	5	13	24	43
Projekty uzupełniające	2	2	3	6	13
SUMA	3	7	16	30	56

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	22	1	6	10	4	43
Projekty uzupełniające	3	0	3	7	0	13
SUMA	25	1	9	17	4	56

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r.	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.
Projekty podstawowe	16 204 689,60	51 256 456,56
Projekty uzupełniające	6 590 235,69	102 554 576,57
SUMA	22 794 925,29	153 811 033,13

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2022 r. według sfer

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2022 r.					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	1 148 394,49	0,00	3 281 865,66	11 079 847,10	694 582,35	16 204 689,60
Projekty uzupełniające	0,00	0,00	6 590 235,69	0,00	0,00	6 590 235,69
SUMA	1 148 394,49	0,00	9 872 101,35	11 079 847,10	694 582,35	22 794 925,29

Źródło: Opracowanie własne.

4. Monitoring założonych wskaźników

Na potrzeby monitoringu w Programie rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitorujących (tabela poniżej), do których przyporządkowane zostały poszczególne cele strategiczne.

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu

Cel strategiczny	Wskaźnik	Zapis w programie rewitalizacji		2022 r.	
		Wartość bazowa	Trend	Wartość	Trend
Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	60,60	↓	32,24	↓
	Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym: kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów	4,88	↓	4,56	↓
Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji	Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców	46,53	↓	26,00	↓
	Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	10,15	↑	13,01	↑
Zapewnienie wysokiej jakości warunków życia mieszkańców	Liczba instytucji kultury* na km ² powierzchni	0,90	↑	0,92	↑
	Liczba obiektów sportowych** na km ² powierzchni	1,50	↑	2,30	↑
	Liczba miejsc w żłobkach	1 347 (419)***	↑	2 947	↑

* Instytucje kultury przyjęte do wycień: filharmonie, teatry, muzea, biblioteki, kina, galerie, domy kultury i kluby osiedlowe.

** Obiekty sportowe przyjęte do wycień: baseny, hale sportowe, korty, lodowiska, osiedlowe obiekty sportowe, szkolne obiekty sportowe, stadion.

*** W Programie rewitalizacji wystąpiła omyłka pisarska. W diagnozie za 2015 r. liczba miejsc w żłobkach samorządowych to 928 natomiast w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych to 419. Łącznie 1347.

Źródło: Opracowanie własne.

5. Spis tabel i rysunków

SPIS TABEL

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych	9
Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych	22
Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji.....	30
Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer	30
Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków	30
Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2022 r. według sfer	30
Tabela 7. Wskaźniki monitoringu.....	31

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji	7
--	---
