



RAPORT Z MONITORINGU ZA ROK 2018 PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA LATA 2017-2023

Opracowanie:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel.: +48 85 869 61 19
e-mail: dsr@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

Białystok, wrzesień 2019

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023	5
2.1. Diagnoza	5
2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji	6
2.3. Cele strategiczne i operacyjne.....	8
3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2018 r.)	9
3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne.....	9
3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne.....	27
3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2018	32
4. Monitoring założonych wskaźników	33
5. Spis tabel i rysunków	34

1. Wstęp

Niniejszy raport stanowi pierwszy monitoring za 2018 r. *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* (według stanu na 31.12.2018 r.). Dokument przedstawia dane za rok 2018. Część opracowania opisująca stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych została opracowana na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych. Obejmuje ona okres od czasu uchwalenia dokumentu do dnia 31.12.2018 r.

Na terenie Białegostoku w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty programowe dedykowane rewitalizacji:

- *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023*, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/559/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- *Zaktualizowany Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023*, przyjęty uchwałą Nr XLIX/750/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wykonując uchwałę Rady Miasta Białystok Nr XXIII/388/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku, Miasto rozpoczęło procedury i zleciło opracowanie firmie zewnętrznej wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Łączny koszt opracowania Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 wyniósł 71 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 63 900,00 zł (54 315,00 z Funduszu Spójności oraz 9 585,00 zł z budżetu państwa). Program opracowano w oparciu o *Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Ministra Rozwoju*.

W 2018 roku *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* został pozytywnie zaopiniowany w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (uchwała Nr 299/4242/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.).

2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

2.1. Diagnoza

Na potrzeby opracowania *Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* przeprowadzono diagnozę całego miasta pod kątem różnorodnych wskaźników (dane za rok 2015). W badanym okresie Białystok był zamieszkały przez 275 513 osób zameldowanych na pobyt stały. Powierzchnia miasta od 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi ok. 102 km². Badanie obejmowało pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną na podstawie, których zostały wyznaczone: obszar zdegradowany i rewitalizacji o koncentracji zjawisk kryzysowych na poziomie wyraźnie przekraczającym wartość dla całego miasta.

Sfera społeczna

Sytuacja społeczna Białegostoku została zbadana na podstawie następujących grup wskaźników: korzystający z pomocy społecznej, przestępczość, edukacja, seniorzy, bezrobocie, aktywność mieszkańców, bezdomność (łącznie 25 wskaźników). Największą liczbę wskaźników w sposób negatywnie odbiegających od średniej dla miasta zidentyfikowano w przypadku 12 osiedli (Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Przydworcowe, Młodych, Dziesięciny I, Dziesięciny II oraz Piaski).

Sfera gospodarcza

Analizując liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców osiedla, największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej stwierdzono na 17 osiedlach (Białostoczek, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Piasta, Skorupy, Mickiewicza, Bema, Zielone Wzgórza, Starosielce, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki i Dojlidy Górne).

Sfera środowiskowa

Na podstawie wskaźników: niedobór terenów zielonych na obszarze miasta, stężenia poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z emisji łącznej w strefie aglomeracji białostockiej oraz powierzchni miejsc występowania wyrobów azbestowych w przeliczeniu na km² osiedla wyznaczono obszary problemowe na 7 osiedlach (Przydworcowe, Piasta, Piasta II, Skorupy, Bema, Kawaleryjskie, Starosielce).

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W ramach określenia obszarów zdegradowanych pod względem sfery przestrzenno-funkcjonalnej posłużono się siedmioma wskaźnikami: średnią liczbą osób korzystających z komunikacji publicznej w przeliczeniu na jeden przystanek, liczbą instytucji kultury na km² powierzchni, liczbą obiektów sportowych na km² powierzchni, liczbą placówek opieki zdrowotnej na km² powierzchni, gęstością zaludnienia [os./km²], niedoborem infrastruktury technicznej oraz żłobków. Wskaźniki wyraźnie przekraczające wartość dla całego miasta zaobserwowano na 16 osiedlach (Białostoczek, Młodych, Antoniuk, Jaroszkówka, Wygoda, Skorupy, Dojlidy, Bema, Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Starosielce, Leśna Dolina, Wysoki Stoczek, Bacieczki, Zawady, Dojlidy Górne).

Sfera techniczna

Analizując liczbę budynków niskoemisyjnych na km², liczbą komunalnych budynków mieszkalnych w Białymstoku niewyposażonych w centralne ogrzewanie i liczbą budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem na km², stwierdzono największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze technicznej na 12 osiedlach (Centrum, Sienkiewicza, Piaski, Przydworcowe, Antoniuk, Jaroszkówka, Piasta II, Skorupy, Mickiewicza, Dojlidy, Kawaleryjskie, Dziesięciny II).

2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Na podstawie diagnozy wyodrębniono te części miasta, w których ilość stwierdzonych problemów społecznych była wyższa od średniej wartości dla miasta oraz zaobserwowano problemy w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje 12 osiedli: Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, Młodych, Przydworcowe, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Piaski.


Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z powyższymi kryteriami obejmuje obszar:

- o powierzchni 19,8 km² (19,4% powierzchni Białegostoku),
- zamieszkały przez 81 209 osoby (29,5% mieszkańców Białegostoku).

Obszar rewitalizacji obejmuje 9 osiedli położonych w trzech podobszarach rewitalizacji:

- Podobszar I (osiedla: Przydworcowe, Centrum, Antoniuk, Bema, Sienkiewicza, Dziesięciny I),
- Podobszar II (osiedla: Skorupy, Dojlidy),
- Podobszar III (osiedle Starosielce).

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji

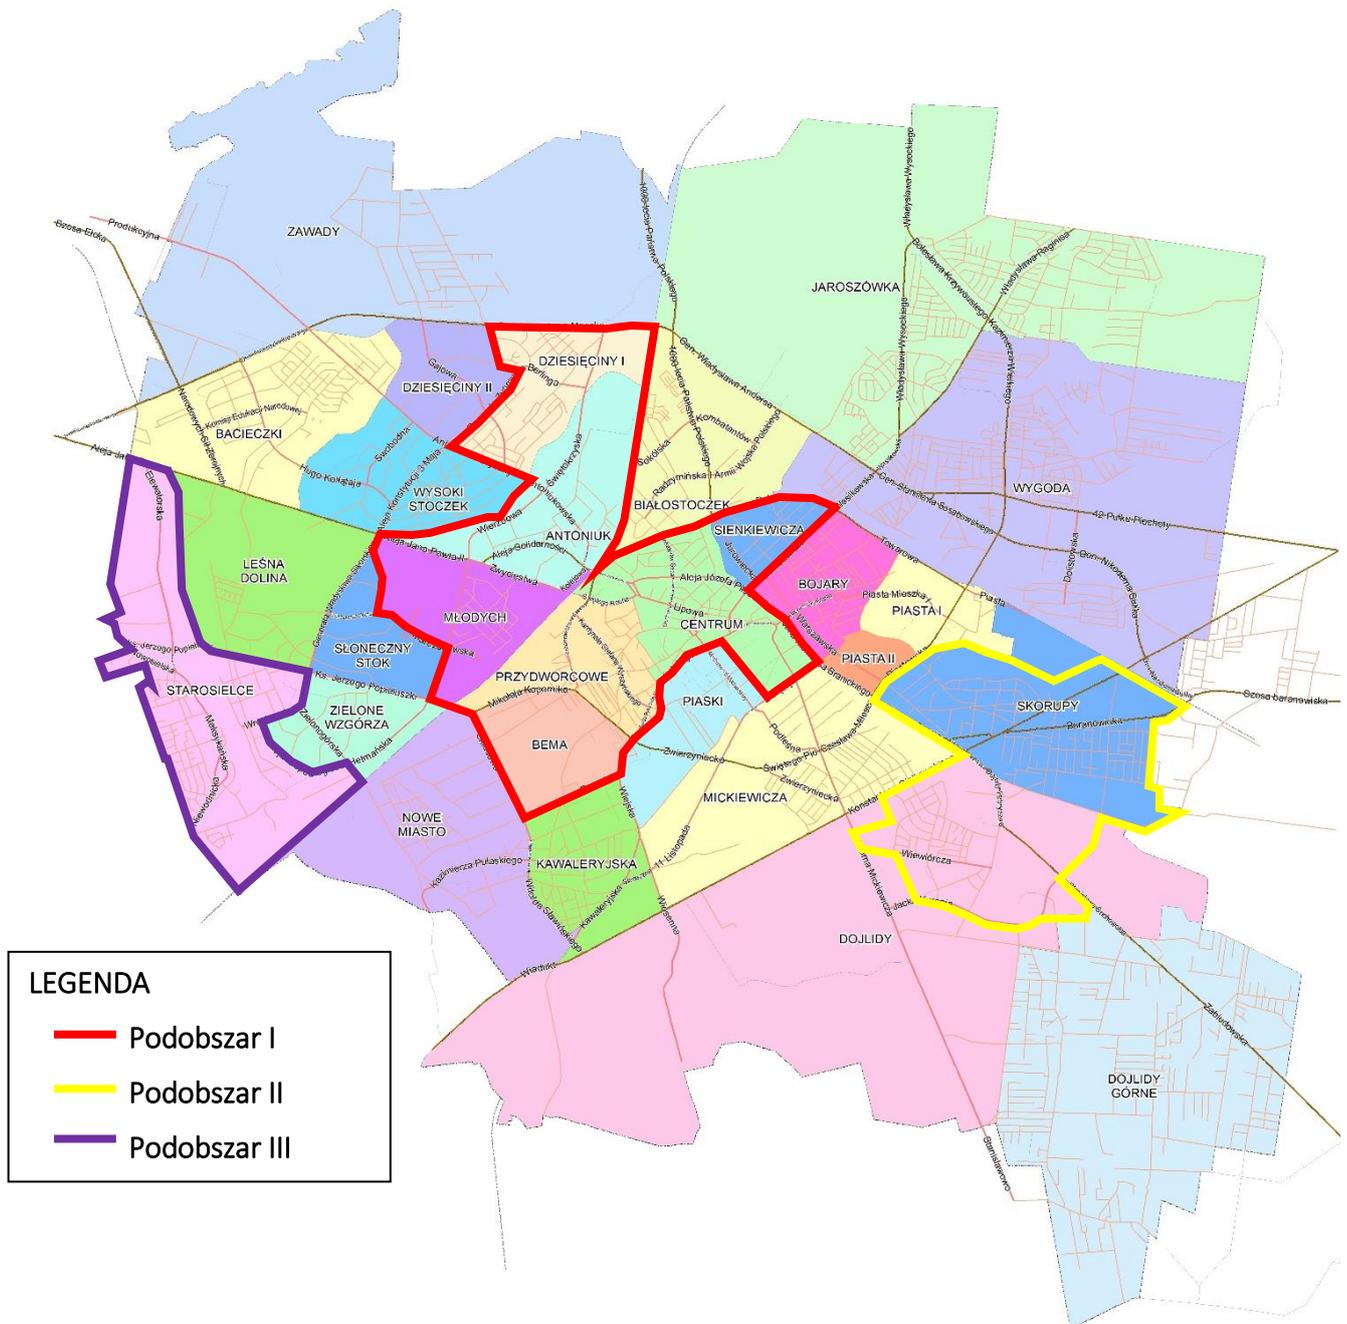

Źródło: Opracowanie własne

2.3. Cele strategiczne i operacyjne

Cele Programu rewitalizacji opracowano w oparciu o zdiagnozowane problemy. W efekcie sformułowane zostały poniższe cele strategiczne i operacyjne.

Cel strategiczny 1. Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel operacyjny 1.1. Silne więzi społeczne i wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta

Cel operacyjny 1.2. Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców

Cel operacyjny 1.3. Zwiększona dostępność do usług społecznych dla mieszkańców

Cel operacyjny 1.4. Wysoka jakość i dostępność opieki nad dziećmi oraz oświaty i edukacji

Cel operacyjny 1.5. Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa w mieście

Cel strategiczny 2. Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji

Cel operacyjny 2.1. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców

Cel operacyjny 2.2. Wysoki poziom dostępności do usług dla mieszkańców

Cel operacyjny 2.3. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej obszarów

Cel strategiczny 3. Zapewnione wysokiej jakości warunki życia mieszkańców

Cel operacyjny 3.1. Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz działających organizacji pozarządowych

Cel operacyjny 3.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej zdegradowanych obszarów miasta

Cel operacyjny 3.3. Atrakcyjna przestrzeń publiczna służąca wszystkim aktorom miasta

Cel operacyjny 3.4. Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel operacyjny 3.5. Wysoki poziom środowiskowych walorów życia mieszkańców

3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2018 r.)

Aktualnie obowiązujący *Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023* zawiera 43 projekty podstawowe o łącznej szacunkowej wartości 278 430 850,00 zł. W programie jest 11 grup przedsięwzięć uzupełniających oraz 13 projektów uzupełniających, których łączna szacunkowa wartość ich realizacji wynosi 98 040 000,00 złotych.

3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z rozbudową budynku gospodarczego i nowym zagospodarowaniem terenu UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt jest w trakcie realizacji.	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 22 października 2018 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 3 595 445,39 zł z terminem realizacji do 18 czerwca 2020 r. Przekazano teren budowy wykonawcy robót.	42 927,00 (środki własne)	108 273,00 (środki własne)	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego, budowa nowych instalacji wewnętrznych, przyłączy, stalowego masztu flagowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz części budynku gospodarczego na garaż, rozbiórka części budynku gospodarczego.
2.	Remont i modernizacja budynku przy ul. Ciepłej 4	Projekt jest w trakcie realizacji.	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 29 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 3 449 524,00	6 920,00 (środki własne)	91 460,00 (środki własne)	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa wewnętrznych instalacji: gazu, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
	UM Departament Spraw Społecznych / Zarząd Mienia Komunalnego		z terminem realizacji do 10 grudnia 2019 r. Przekazano teren budowy wykonawcy robót.			na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, budowa doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, budowa zagospodarowania terenu, zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na garaż, budowa ogrodzenia.
3.	Program zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Białej w Białymstoku realizowany etapami UM Departament Urbanistyki / UM Departament Inwestycji	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	W latach 2019-2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa mostku na rzece Białej łączącego ul. Jurowiecką z ul. Włókienniczą w sąsiedztwie Regionalnego Ośrodka Telewizji Publicznej.
4.	Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na Osiedlu Bema w Białymstoku Rada Osiedla Bema / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt jest planowany do realizacji.	-----	0,00	0,00	W 2019 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W przypadku otrzymania dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w 2020 r. <u>Dodatkowe informacje:</u> W lipcu 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5.	Białystok miastem wyciągającym dłoń do potrzebujących Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt jest w trakcie realizacji.	W roku 2018 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 działały następujące placówki dla osób bezdomnych: ogrzewalnia na 50 miejsc, noclegownia na 32 miejsca, schronisko na 18 miejsc oraz odbywały się zajęcia Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. W 2018 r. wykonano następujące prace:	399 593,00 w tym: 299 593,00 (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)	399 593,00 w tym: 299 593,00 (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)	Stowarzyszenie planuje pozyskać środki na dokończenie prac związanych z instalacją przeciwpożarową (założenie hydrantów wewnętrznych) oraz założenie wentylacji w niektórych pomieszczeniach na piętrze. <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt posiada dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			odmalowanie części pomieszczeń, założenie monitoringu, wstawienie drzwi ognioodpornych i okien oddymiających, wykonanie kuchni, pokoju lekarskiego i pielęgniarskiego, wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych łazienek na piętrze (noclegownia), remont łazienek ogrzewalni, wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich przy obu wejściach do budynku, wymiana wszystkich drzwi i okien w pokojach schroniska na parterze, założenie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach schroniska na parterze.	100 000,00 (darowizny od firm i praca wolontariuszy, w tym Prezydenta Miasta Białegostoku)	100 000,00 (darowizny od firm i praca wolontariuszy, w tym Prezydenta Miasta Białegostoku)	
6.	Nowa szansa na nowe życie w mieszkaniach treningowych dla osób bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt jest w trakcie realizacji.	W zakresie projektu wchodzi dwa budynki: przy ul. Żelaznej oraz Włókienniczej. W budynku przy ul. Włókienniczej nie prowadzono żadnych prac, ponieważ organizacja zgłaszająca projekt nie posiada żadnej umowy na użytkowanie obiektu. W budynku przy ul. Żelaznej 23, prowadzono prace renowacyjne dawnych pokoi treningowych (odnowionych zostało 5 pokoi wraz z 2 aneksami kuchennymi i łazienkami) oraz wyremontowano pomieszczenia na piętrze na przeniesienie z parteru działalności sklepu charytatywnego „Modny Grosik” z odzieżą używaną,	25 000,00 (środki własne)	25 000,00 (środki własne)	Stowarzyszenie chce przeprowadzić renowację pozostałych dwóch mieszkań treningowych oraz założyć w budynku monitoring i internet. <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt posiada dokumentację projektową.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			który prowadzony jest w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia od 2017 r. Wykonano również część prac renowacyjnych pomieszczeń dawnego baru „Okienko” (rozpoczął on swoją działalność w kwietniu 2019 r. w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia). Wymieniono także dużą część instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zainstalowano piec gazowy. W ostatnim kwartale 2018 w mieszkaniach zamieszkało 6 osób bezdomnych, podopiecznych znajdujących się na ostatnim etapie wychodzenia z bezdomności.			
7.	Centrum Aktywności Lokalnej na Włókienniczej Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
8.	Aktywny Antoniuk Fundacja Laboro, Stowarzyszenie My dla Innych	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
9.	Dawna Misja Barbikańska centrum życia kulturalnego Zbór „Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku”, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”	Projekt jest w trakcie realizacji.	Przez cały rok 2018 w budynku był sprawowany kult religijny Kościoła Chrześcijan Baptystów „Droga Zbawienia” w Białymstoku. W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” funkcjonowała Kawiarnia „W Starym Kinie”, gdzie miało miejsce wiele spotkań	0,00	0,00	Realizacja projektu przez Stowarzyszenie jest uzależniona od wyjaśnienia stanu prawnego obiektu. W roku 2018 toczyło się postępowanie przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną pomiędzy Miastem Białymstok a pierwszym Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			organizowanych przez białostockie organizacje pozarządowe: szkolenia, konferencje, warsztaty, odczyty, koncerty charytatywne, spotkania miłośników książek czy gier fabularnych i planszowych, spotkania świąteczne, spotkania seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży i dzieci itp.			
10.	STAROTEKA - biblioteka multimedialna, formalnie filia biblioteczna Osoba fizyczna	Projekt nie był realizowany	-----	0,00	0,00	-----
11.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku Dyrektor Szkoły / UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	0,00	141 450,00 (środki własne)	Wykonanie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie stropodachu szkoły i zaplecza, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymiana okien kondygnacji naziemnych, wymiana okien piwnic, zamurowanie zbędnych okien (2 szt.), wymiana instalacji c.w.u., wymiana instalacji c.o., wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku na energooszczędne). <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt posiada dokumentację projektową. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 02.08.2019 r.
12.	Dom Sąsiedzki „Na Rocha” UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
13.	Dostosowanie budynku przy ulicy św. Rocha 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt jest w trakcie realizacji.	Zamontowano system głośnomówiący w dźwigu znajdującym się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 ułatwiający korzystanie z windy osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom starszym.	2 270,00 (środki własne)	2 270,00 (środki własne)	Montaż tablic tyflograficznych w 2020 roku.
14.	Budowa zbiornika retencyjnego zlewnia z ul. Bohaterów Monte Cassino – PKP – ul. Stołeczna UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
15.	Zielone podwórka w Centrum Białegostoku - modernizacja istniejących i zagospodarowanie nowych terenów zieleni urządzonej UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
16.	„Bądź najlepszy, bądź aktywny” UM Departament Spraw Społecznych / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Projekt jest planowany do realizacji.	-----	0,00	0,00	Nabycie przez osoby długotrwale bezrobotne umiejętności poruszania się po rynku pracy, zmiany myślenia o sobie, wzrost wiary we własne siły i możliwości. Podjęte działania i realizacja projektu nastąpi w 2019 r. <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt zostanie zrealizowany w ramach działalności zawodowej pracowników, bez ponoszenia nakładów pieniężnych. Realizowany będzie w czasie godzin pracy, przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów biurowych. Ośrodek nie występował i nie planuje występować o środki finansowe. Warsztaty aktywnego

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
						poszukiwania pracy zostaną zrealizowane we własnym zakresie.
17.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Antoniuk UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
18.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Dębowej i Cedrowej UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
19.	Klub Seniora UM Departament Spraw Społecznych	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
20.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 7 UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	0,00	58 179,00 (środki własne)	Wykonanie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian parteru i pietra, docieplenie ścian piwnic, docieplenie stropodachu, wymiana okien parteru i piętra, wymiana okien piwnic, wymiana drzwi głównych, wymiana drzwi na elewacjach bocznych, likwidacja zsyków na węgiel i ziemniaki, wymiana instalacji c.w.u, wymiana instalacji c.o.). <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt posiada dokumentację projektową. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 02.08.2019 r.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
21.	„Aktywny Senior” – kawiarenka z salą rehabilitacyjną UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
22.	„Święto Sąsiadów” – coroczna impreza edukacyjno-kulturalna UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
23.	Budowa zbiornika retencyjnego – ul. Gen. J. Hallera / Świętokrzyska UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
24.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Gen. J. Hallera przy ogrodach działkowych UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
25.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej Nr 28, ul. Warmińska 55 UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	130 589,33 (środki własne)	135 589,28 (środki własne)	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
26.	Budowa zbiornika retencyjnego – zlewnia z ul. Korzeniowskiego przed ogrodami działkowymi UM Departament Gospodarki Komunalnej / UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
27.	Biblioteka bez barier - modernizacja i rozszerzenie funkcji biblioteki służącej mieszkańcom osiedla Dojlidy UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
28.	„Sąsiedzka pomoc wzajemna” – mikroinicjatywa samopomocowa UM Departament Spraw Społecznych / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Projekt został zrealizowany.	W roku 2018 pracownicy socjalni Zespołu Pracowników Socjalnych nr 7 MOPR zrealizowali dwa projekty socjalne pod nazwą "W każdym wieku - siła w człowieku" oraz "W zdrowym ciele zdrowy duch", których celem była aktywizacja osób w wieku emerytalnym. Osoby te dysponują możliwościami i czasem wolnym, który mogą poświęcić na drobną pomoc swoim sąsiadom. Pierwszym etapem realizacji wzajemnej pomocy było budzenie aktywności i pomoc w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich, które stanowią będą podstawę do wzajemnej wymiany usług i pomocy. Oba projekty miały na celu podniesienie świadomości uczestników projektu na temat znaczenia zdrowego	0,00	0,00	Projekty socjalne skierowane do seniorów nadal będą realizowane przez pracowników socjalnych Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 7 w ramach obowiązków służbowych. <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekty powstały i zostały zrealizowane przy współudziale pracowników socjalnych Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 7 w Białymstoku.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			żywienia i stylu życia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w zajęciach klubu seniora MOPR i korzystanie z ofert karty aktywnego seniora, a także wspieranie integracji społecznej seniorów poprzez umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich.			
29.	„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej” UM Departament Spraw Społecznych	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	Projekt został zgłoszony jako propozycja do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosowanie odbędzie się między 1 a 15 października 2019 r. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy w wersji papierowej lub przez internet.
30.	„Historia Starosielc w Galerii Grafitti” UM Departament Spraw Społecznych	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	Nie są planowane dalsze działania w tym zakresie. <u>Dodatkowe informacje:</u> W roku 2017 mieszkańcy osiedla przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej przy współudziale pracowników socjalnych Zespołu Pracowników Socjalnych nr 7 opracowali i złożyli projekt „Historia Starosielc w Galerii Murali” do Budżetu Obywatelskiego, prowadzili promocję projektu i zbierali głosy poparcia. Projekt nie przeszedł do fazy realizacji z uwagi na zbyt małą liczbę głosów.
31.	„Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Starosielc jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych.” UM Departament Spraw Społecznych / MOPR	Projekt jest w trakcie realizacji.	Pracownicy socjalni MOPR ZPS Nr 7 od kilku lat realizują projekty socjalne w ramach obowiązków zawodowych. W roku 2018 zrealizowali następujące projekty: „Animacja i organizacja środowiska lokalnego na osiedlu Barszczańska i Klepacka w roku 2018”	0,00	0,00	W dalszym ciągu realizowane będą projekty socjalne w celu osiągnięcia zakładanych celów społecznych. Celem realizowanych projektów jest kontynuowanie działań mających na celu wzmocnienie i poszerzenie fundamentów społeczeństwa partycypacyjnego. Podejmowane inicjatywy mają na celu utrwalenie dotychczasowych postaw i zachowań, zachęcanie

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			w okresie styczeń-grudzień 2018 r. oraz „Organizacja i animacja środowiska lokalnego na osiedlu Barszczańska i Klepacka w roku 2018” w okresie sierpień-grudzień 2018r. Efektem działań animacyjnych pracowników socjalnych było przeszkolenie mieszkańców z zakresu: pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego, promowania projektów oraz zasad przydzielania środków finansowych.			do podejmowania inicjatyw w zakresie podnoszenia aktywności na forum publicznym, ruchów społecznych i inicjatyw oddolnych, rozwijanie wolontariatu mieszkańców.
32.	Klub osiedlowy „Razem” przy ul. Barszczańskiej 5 UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt jest w trakcie realizacji.	Miasto Białystok w procedurze konkursowej zleciło realizację zadania Stowarzyszeniu Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”. „Klub osiedlowy „Aktywni”, ul. Barszczańska 5 ” (nazwa działania ww. organizacji) funkcjonował w lokalu pod adresem ul. Barszczańska 5, w terminie 6.08. - 31.12.2018 r. Inicjatywa została zrealizowana jako efekt wniosku zgłoszonego przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2016 pod nazwą „Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenia klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce”. Zadanie polegało na prowadzeniu ogólnodostępnego klubu na osiedlu Starosielce. Celem funkcjonowania	48 104,00 (środki własne)	93 190,00 (środki własne)	Zakłada się kontynuację dotychczasowego modelu działania Klubu w 2019 r. W wyniku kolejnego otwartego konkursu ofert zostało zlecone zadanie z realizacji przez Stowarzyszenie wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” na kwotę 25 000 zł.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			<p>klubu było umożliwienie mieszkańcom realizacji inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnej poprzez bezpłatne udostępnianie przestrzeni do aktywności oraz objęcie mieszkańców wsparciem animacyjnym i edukacyjnym.</p> <p>Z potencjału Klubu mogli korzystać mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Klub zapewniał możliwość integrowania się mieszkańców, rozwój więzi lokalnych, podwyższanie poziomu zaufania społecznego i partycypacji społecznej mieszkańców dla rozwiązywania lokalnych problemów.</p> <p>Realizacja działań w klubie osiedlowym odbywała się w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przeprowadzona diagnozę potrzeb mieszkańców, b) opracowanie wspólnie z mieszkańcami programu działalności klubu, dopasowanego do ich potrzeb i oczekiwań, c) społeczne zaangażowanie mieszkańców – włączenie się w przygotowywanie i wykonanie inicjatyw oraz ich ewaluację, d) opracowanie kalendarza wydarzeń, 			

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			<p>e) promocje wydarzeń i inicjatyw realizowanych w klubie.</p> <p>Klub był czynny 6 dni w tygodniu łącznie 20 godzin, część zajęć odbywała się w godzinach przedpołudniowych. W ramach działania klubu odbywały się wielopokoleniowe spotkania mieszkańców, podczas których:</p> <p>a) podejmowane były aktualne tematy z zakresu partycypacji społecznej,</p> <p>b) zajęcia tematyczne: kulinarne, informatyczne, krawieckie, plastyczno-techniczne, „zrób to sam” (drobne prace naprawcze na rzecz mieszkańców osiedla), wymiany międzypokoleniowej (np. nauka robienia na drutach i szydełku, wyszywania), kącik „wymiany życzliwości sąsiedzkiej”,</p> <p>c) indywidualne spotkania rodzin z psychologiem – terapeutą dzieci i młodzieży,</p> <p>d) funkcjonowała grupa samopomocowa dzieci i młodzieży, w ramach której świadczona była wzajemna pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.</p> <p>Zapewniono możliwość spędzenia czasu wolnego poprzez korzystanie z gier planszowych, edukacyjnych,</p>			

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
			organizowano gry i zabawy plenerowe adresowane do całych rodzin. Zorganizowano też możliwość wypożyczenia książek (1.800 woluminów).			
33.	Budowa parku przy ul. Szkolnej UM Departament Gospodarki Komunalnej / Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	Dnia 18.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. firmą – HYDROS PLUS. Wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną, małą architekturę (ławki, kosze, stoliki do gry w szachy, oświetlenie oraz część alejek).	396 848,79 (środki własne)	397 682,12 (środki własne)	Inwestycję odebrano 11.03.2019 r. W 2019 r. na tej samej części działki są realizowane dwa projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Budowa linarium – największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej” oraz „Budowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej”.
34.	Mini bazarki osiedlowe i punkty wymiany towarów UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
35.	Podwórkowe Centrum Edukacji i Dialogu Społecznego – ławeczka UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
36.	Kulturalny Dom Spotkań UM Centrum Aktywności Społecznej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
37.	Budowa kanalizacji deszczowej w obszarze rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Depowej.	6 150,00 (środki własne)	6 150,00 (środki własne)	W 2019 r. planowane jest rozliczenie końcowe opracowanej dokumentacji projektowej. <u>Dodatkowe informacje:</u> Pozostałe inwestycje (zgłoszone w karcie rewitalizacyjnej) nie są ujęte w budżecie miasta.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
38.	<p>Instalowanie źródeł energii odnawialnej, w szczególności źródeł solarnych (ciepłych i fotowoltaicznych) na obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji na terenie miasta Białystok</p> <p>UM Departament Ochrony Środowiska</p>	Projekt jest w trakcie realizacji.	<p>W dniu 9 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” - Cz. I: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta Białystok oraz Cz. II: Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Białystok. W dniu 2 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiotową inwestycję (zgodnie z założeniami projektu) w terminie do dnia 31 października 2019 r. Zawarto również umowy uczestnictwa w projekcie z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu na montaż kolektorów.</p>	0,00	0,00	<p>Projekt pn. Modernizacja źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0012/17-00 z dnia 23 listopada 2017 r. w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przyjęto, iż projekt obejmie swym zakresem 450 gospodarstw domowych, w tym założono wykonanie 225 szt. instalacji solarnych oraz 225 szt. instalacji kotłów gazowych. Inwestycja zostanie sfinansowana częściowo dotacją ze środków europejskich (do 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) oraz z wkładu własnego wnoszonego przez mieszkańców gminy w wysokości ok.15 % zakładanych kosztów inwestycji.</p> <p>W 2019 roku Wykonawca wykona weryfikację techniczną na nieruchomościach nowych uczestników oraz jest w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej dla wszystkich uczestników projektu. Prace instalacyjne zgodnie z pierwotnym harmonogramem miały rozpocząć się na początku marca i zakończyć najpóźniej 31 października 2019 r. W dniu 28 stycznia 2019 r. Wykonawca wystąpił o aktualizację harmonogramu, zgodnie z którą prace instalacyjne mają rozpocząć się od lipca 2019 r.</p> <p><u>Dodatkowe informacje:</u> W ramach projektu planowana jest modernizacja następującej liczby instalacji (Obrębami).</p>

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje																																																																														
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obręb</th> <th>Kolektor</th> <th>Kocioł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bacieczki</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>Bagnówka</td><td>22</td><td>22</td></tr> <tr><td>Bema</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>Białostoczek Płd.</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>Białostoczek Płn.</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>Bojary</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dojlidy</td><td>7</td><td>13</td></tr> <tr><td>Dojlidy Górne</td><td>16</td><td>15</td></tr> <tr><td>Halickie</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>Marczuk</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mickiewicza</td><td>6</td><td>12</td></tr> <tr><td>Nowe Miasto</td><td>12</td><td>2</td></tr> <tr><td>Pieczurki</td><td>8</td><td>16</td></tr> <tr><td>Pietrasze</td><td>16</td><td>29</td></tr> <tr><td>Przemysłowy</td><td>16</td><td>10</td></tr> <tr><td>Skorupy</td><td>9</td><td>5</td></tr> <tr><td>Starosielce Płd</td><td>19</td><td>12</td></tr> <tr><td>Starosielce Płn.</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ścianka</td><td>5</td><td>1</td></tr> <tr><td>Śródmieście</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>Wygoda</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>Wysoki Stoczek</td><td>15</td><td>19</td></tr> <tr><td>Zagórki</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Zawady</td><td>15</td><td>11</td></tr> <tr><td>Suma końcowa</td><td>225</td><td>225</td></tr> </tbody> </table> <p> - obręby, przez które przebiega granica obszaru rewitalizacji.</p>	Obręb	Kolektor	Kocioł	Bacieczki	16	17	Bagnówka	22	22	Bema	0	3	Białostoczek Płd.	5	4	Białostoczek Płn.	2	3	Bojary	4	3	Dojlidy	7	13	Dojlidy Górne	16	15	Halickie	2	0	Marczuk	2	4	Mickiewicza	6	12	Nowe Miasto	12	2	Pieczurki	8	16	Pietrasze	16	29	Przemysłowy	16	10	Skorupy	9	5	Starosielce Płd	19	12	Starosielce Płn.	2	1	Ścianka	5	1	Śródmieście	3	4	Wygoda	19	19	Wysoki Stoczek	15	19	Zagórki	4	0	Zawady	15	11	Suma końcowa	225	225
Obręb	Kolektor	Kocioł																																																																																		
Bacieczki	16	17																																																																																		
Bagnówka	22	22																																																																																		
Bema	0	3																																																																																		
Białostoczek Płd.	5	4																																																																																		
Białostoczek Płn.	2	3																																																																																		
Bojary	4	3																																																																																		
Dojlidy	7	13																																																																																		
Dojlidy Górne	16	15																																																																																		
Halickie	2	0																																																																																		
Marczuk	2	4																																																																																		
Mickiewicza	6	12																																																																																		
Nowe Miasto	12	2																																																																																		
Pieczurki	8	16																																																																																		
Pietrasze	16	29																																																																																		
Przemysłowy	16	10																																																																																		
Skorupy	9	5																																																																																		
Starosielce Płd	19	12																																																																																		
Starosielce Płn.	2	1																																																																																		
Ścianka	5	1																																																																																		
Śródmieście	3	4																																																																																		
Wygoda	19	19																																																																																		
Wysoki Stoczek	15	19																																																																																		
Zagórki	4	0																																																																																		
Zawady	15	11																																																																																		
Suma końcowa	225	225																																																																																		

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
39.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Mieście Białystok UM Departament Edukacji	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
40.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 UM Departament Inwestycji	Projekt jest planowany do realizacji.	W 2018 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które w 2019 roku unieważniono gdyż cena ofert znacznie przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowania przetargowe zostały wstrzymane, z uwagi na otrzymaną z Departamentu Edukacji informację o braku lokalu zastępczego na potrzeby tego przedszkola na czas realizacji inwestycji.	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
41.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	Podpisano z wykonawcą umowę na roboty budowlane. Zaawansowanie robót 85%.	4 172 080,03 (środki własne)	4 230 379,05 (środki własne)	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 08.02.2019 r. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa warunków lokalowych przedszkola oraz nastąpiło zwiększenie o 2 oddziały przedszkolne. Wartość inwestycji - 4 157 042,71 zł.
42.	Rewitalizacja osiedli poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców - monitoring wizyjny UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
43.	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 42	Projekt jest w trakcie realizacji.	Zaktualizowano kosztorys inwestorskie. W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji	4 059,00 (środki własne)	55 301,00 (środki własne)	Wykonanie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, docieplenie stropodachu, wymiana okien parteru i pietra, wymiana

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
	UM Departament Inwestycji		z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.			okien piwnic, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.w.u., wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku na energooszczędne). <u>Dodatkowe informacje:</u> Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 02.08.2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych

3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne

Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
12.	Przebudowa budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowanie fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Arsenał, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	Ponoszone przez Galerię nakłady są nakładami w ramach bieżącej działalności. Nie została zakupiona część działki od PGE, co uniemożliwia zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, w ramach projektu rewitalizacyjnego. Posiadana dokumentacja projektowa jest niekompletna i nieaktualna. Galeria nie zakończyła więc opracowywania dokumentacji do adaptacji budynku wg projektu rewitalizacyjnego i nie aktualizowała dokumentacji już opracowanej; nie ma też na to środków. Galeria żeby prowadzić w obiekcie działania statutowe, musi wykonywać bieżące naprawy i ulepszenia. W 2018 r. w ramach pilnych bieżących prac naprawczych (przecieki dachu) Galeria Arsenał wykonała remont dachu na budynku elektrowni. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu Miasta Białystok. Jako tymczasowe, na najbliższe dwa lata planowane są działania: prowizoryczne wykonanie podłóg, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w ścianie wychodzącej na rzekę, wykonanie nowej sieci elektrycznej w całości budynku, zakupienie i montaż oświetlenia. Nie są to prace w ramach projektu rewitalizacji, a umożliwiające prowadzenie w budynku działalności.
13.	BTL - przestrzeń kreatywna UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Białostocki	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	W IV kwartale 2018 r. wpisano do budżetu Miasta na 2019 rok, jako zadanie do zrealizowania w planie finansowym instytucji na 2019 rok - „opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2”.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
	Teatr Lalek, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu					W ramach dotacji celowej w wysokości 45 000 zł, na wydatki majątkowe dla BTL ujęto środki w wydatkach budżetu Miasta w 2019 r. W 2019 r. BTL opracuje dokumentację projektową na modernizację budynku oraz szczegółowy kosztorys realizacji zadania. Wg niego będzie poszukiwać źródeł finansowania zadania na 2020 rok i kolejne lata.
14.	Adaptacja zabytkowego obiektu na cele kultury - siedzibę domu kultury „ŚRÓDMIEŚCIE” UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Dom Kultury „Śródmieście”, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	<u>Dodatkowe informacje:</u> Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji o przeznaczeniu tego obiektu na nową siedzibę Domu Kultury „Śródmieście”.
15.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowego obiektu na siedzibę Galerii im. Sleńdzińskich UM Departament Kultury, Promocji i Sportu / Galeria Sleńdzińskich, UM Departament Kultury, Promocji i Sportu	Projekt nie był realizowany.	W IV kwartale 2018 r. Galeria podpisała umowę użyczenia budynku z Zarządem Mienia Komunalnego na czas nieoznaczony. Przejęto budynek protokołem z dnia 29.10.2018 r. Podpisano umowy z firmami dostarczającymi media: wodę, prąd, centralne ogrzewanie, ścieki. W 2018 r. Galeria wystąpiła do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wytyczne konserwatorskie dotyczące budynku.	0,00	0,00	W 2019 r. Galeria rozpoczęła inwentaryzację obiektu. Rozeznano możliwości adaptacji budynku na potrzeby instytucji i sporządzenia dokumentacji architektonicznej. Rozpoczęto bieżące naprawy, w tym m.in.: - zlecono pomiar instalacji elektrycznej oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznej; - wykonano bieżący remont pomieszczeń biurowych i magazynowych na piętrze; - wykonano nową instalację alarmową, przeciwpożarową, internetową, zamontowano kamery, czujniki antywłamaniowe i czujniki dymu; - zbudowano serwerownię. Galeria przeprowadziła się częściowo do obiektu w czerwcu 2019 r.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
						Na 2020 r. planuje się wpisanie środków do budżetu Miasta na wykonanie dokumentacji technicznej/architektonicznej dotyczącej adaptacji obiektu. <u>Dodatkowe informacje:</u> Ponoszone nakłady są w ramach bieżącej działalności instytucji. Galeria nie opracowała projektu dokumentacji technicznej dotyczącej kompletnej adaptacji budynku i nie ma na to środków.
16.	Rewaloryzacja Parku Lubomirskich w Białymstoku UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku - wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-139, działki nr: 776/3, 777/7, 777/14 obr. 21 Dojlidy, łączna powierzchnia terenu opracowania 12,6564 ha. Zabezpieczono środki na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Lubomirskich w budżecie na 2019 r.
17.	Usprawnienie połączenia pomiędzy osiedlami Centrum i Białostoczek UM Zarząd Dróg Miejskich	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
18.	Przewóz Osób Niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym. Zwiększenie dostępności przez osoby niepełnosprawne do przewozów	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	Zakup mikrobusów nie został zaplanowany w budżecie na 2019 r. Przewozy są realizowane posiadanym taborem.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
	UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej					
19.	Przyjazne, wygodne i zielone otoczenie przystanków komunikacji miejskiej UM Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej / UM Departament Gospodarki Komunalnej	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	W marcu 2019 r. do Departamentu Gospodarki Komunalnej zostało przyporządkowane zadanie dot. dostawy i montażu trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania "Zielone przystanki" wraz z pielęgnacją gwarancyjną roślin. Zadanie zostało częściowo zrealizowane, ustawione zostały dwa tzw. "zielone przystanki". Mieszkańcy Białegostoku w internetowym głosowaniu zdecydowali, iż trzeci zielony przystanek zostanie ustawiony przy ul. Pałacowej.
20.	Budowa żłobka na osiedlu Wygoda UM Departament Inwestycji	Projekt jest w trakcie realizacji.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie realizacji.	0,00	144,00 (środki własne)	Budowa obiektu żłobka.
21	Likwidacja barier infrastrukturalnych kolidujących z docelowym przeznaczeniem terenu UM Departament Urbanistyki	Projekt nie był realizowany.	-----	0,00	0,00	-----
22.	Budowa zbiorników retencyjnych poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Merkurego jest w trakcie budowy. Zakres wykonany: kanalizacja deszczowa – 0%, renowacja rowu – 93%, schody terenowe – 0%, zbiornik retencyjny – 81%, zastawka – 100%.	512 696,73 (środki własne)	512 696,73 (środki własne)	Inwestycję odebrano 10.04.2019 r. <u>Dodatkowe informacje:</u> Pozostałe inwestycje nie są ujęte w budżecie miasta.

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2018 r.	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Dodatkowe informacje
23.	Budowa kanalizacji deszczowej – poza obszarem rewitalizacji UM Departament Gospodarki Komunalnej / Zarząd Dróg Miejskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, ul. Króla Zygmunta Augusta, ul. Produkcyjnej na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.	60 324,20 (środki własne)	60 324,20 (środki własne)	W roku 2019 planowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej oraz w ul. Produkcyjnej. <u>Dodatkowe informacje:</u> Pozostałe ulice wymienione w projekcie nie są ujęte w budżecie miasta.
24.	Wykonanie utwardzenia stanowisk dla pojazdów oraz chodnika (osiedle Bema) Osoba fizyczna / Zarząd Mienia Komunalnego	Projekt nie był realizowany.	W 2018 r. projekt nie był realizowany.	0,00	0,00	Nie planuje się realizacji zadania w latach 2019/2020. <u>Dodatkowe informacje:</u> Projekt nie może być zrealizowany z uwagi na to, ze działka nr 184/83 obr. 8 objęta jest roszczeniem w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gen. J. Bema 91, 93, 95, 97 w Białymstoku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych

3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2018

Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				SUMA
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany	
Projekty podstawowe	2	17	1	23	43
Projekty uzupełniające	0	3	0	10	13
SUMA	2	20	1	33	56

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	22	1	6	10	4	43
Projekty uzupełniające	3	0	3	7	0	13
SUMA	25	1	9	17	4	56

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r.	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2018 r.
Projekty podstawowe	5 234 541,15	5 744 516,45
Projekty uzupełniające	573 020,93	573 164,93
SUMA	5 807 562,08	6 317 681,38

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2018 r. według sfer

	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2018 r.					SUMA
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Projekty podstawowe	474 967,00	0,00	0,00	4 755 515,15	4 059,00	5 234 541,15
Projekty uzupełniające	0,00	0,00	512 696,73	60 324,20	0,00	573 020,93
SUMA	474 967,00	0,00	512 696,73	4 815 839,35	4 059,00	5 807 562,08

Źródło: Opracowanie własne

4. Monitoring założonych wskaźników

Na potrzeby monitoringu w Programie rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitorujących (tabela poniżej), do których przyporządkowane zostały poszczególne cele strategiczne. Dane niezbędne do obliczenia poniższych wskaźników zostały pozyskane od:

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu

Cel strategiczny	Wskaźnik	Zapis w programie rewitalizacji		2018 r.	
		Wartość bazowa	Trend	Wartość	Trend
Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	60,6	↓	39,54	↓
	Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym: kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów	4,88	↓	4,15	↓
Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem gospodarczym obszar rewitalizacji	Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców	46,53	↓	29,21	↓
	Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	10,15	↑	11,67	↑
Zapewnione wysokiej jakości warunki życia mieszkańców	Liczba instytucji kultury* na km ² powierzchni	0,9	↑	0,96	↑
	Liczba obiektów sportowych** na km ² powierzchni	1,5	↑	2,35	↑
	Liczba miejsc w żłobkach	1 347 (419)***	↑	2 096	↑

* Instytucje kultury przyjęte do wyliczeń: filharmonie, teatry, muzea, biblioteki, kina, galerie, domy kultury i kluby osiedlowe.

** Obiekty sportowe przyjęte do wyliczeń: baseny, hale sportowe, korty, lodowiska, osiedlowe obiekty sportowe, szkolne obiekty sportowe, stadion.

*** W Programie rewitalizacji wystąpiła omyłka pisarska. W diagnozie za 2015 r. liczba miejsc w żłobkach samorządowych to 928 natomiast w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych to 419. Łącznie 1347.

Źródło: Opracowanie własne

5. Spis tabel i rysunków

SPIS TABEL

Tabela 1. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych	9
Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych	27
Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji.....	32
Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer	32
Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków	32
Tabela 6. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2018 r. według sfer	32
Tabela 7. Wskaźniki monitoringu.....	33

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji	7
--	---
