




RAPORT Z MONITORINGU ZA ROK 2024
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA LATA 2024-2034



Opracowanie:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel.: +48 85 869 6119
e-mail: dsr@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

Białystok, wrzesień 2025 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034	5
2.1. Diagnoza	5
2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji	6
2.3. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych.....	8
2.4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne.....	8
3. System monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034.....	14
3.1. Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych	14
3.2. Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	35

1. Wstęp

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Miasto Białystok uruchomiło proces rewitalizacji w 2010 r., w oparciu o „Lokalny Program Rewitalizacji Białegostoku na lata 2010-2015”, który umożliwił zainicjowanie pierwszych działań naprawczych na terenie uznanym za zdegradowany. Kolejnym planem odnowy i ożywienia miejskich obszarów zdegradowanych był „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. W związku z tym, iż rewitalizacja jest procesem długofalowym i ciągłym, uchwałą Nr III/20/24 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r., przyjęto kolejny dokument pn. „Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024–2034” (GPRB), ukierunkowany na prowadzenie dalszych działań rewitalizacyjnych.

Niniejszy raport za 2024 r. stanowi pierwszy monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024–2034” (według stanu na 31.12.2024 r.). Celem dokumentu jest syntetyczne i przejrzyste przedstawienie stanu wdrażania GPRB. Program zakłada realizację łącznie 43 przedsięwzięć, w tym 30 przedsięwzięć podstawowych oraz 13 uzupełniających, których wdrażanie odbywa się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji i częściowo w powiązaniu z obszarem rewitalizacji.

System monitorowania przedsięwzięć ujętych w GPRB obejmuje opracowywanie corocznych raportów z postępów w ich realizacji. Raporty przedstawiają ocenę stopnia realizacji projektów, a także kontrolę osiągniętych w wyniku ich wdrożenia efektów. Informacje dotyczące stanu faktycznego zaplanowanych w GPRB przedsięwzięć zbierane są za pomocą formularzy przedkładanych przez realizatorów projektów.


2. Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

2.1. Diagnoza

Pierwszym krokiem w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji była analiza uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, której celem był podział miasta na mniejsze jednostki analityczne. Początkowo wykorzystano podział na osiedla, który był wykorzystany w Programie rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023. Natomiast po przeanalizowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej, a także z uwagi na duże i nieproporcjonalne powierzchnie, część z nich zdecydowano się podzielić na mniejsze.

W granicach Białegostoku wyznaczono 45 jednostek strukturalnych. Wydzielono także 7 jednostek niezamieszkałych: zwarte kompleksy leśne (4 i 43), zwarty kompleks rolny (1), zwarty kompleks ogródków działkowych (12), teren o przeważającej funkcji produkcyjnej (19), teren kolejowy (23) oraz teren lotniska (44). Ostateczne modelowanie granic jednostek zostało przeprowadzone z uwzględnieniem podziałów ewidencyjnych.

Rysunek 1. Podział miasta Białegostok na jednostki strukturalne

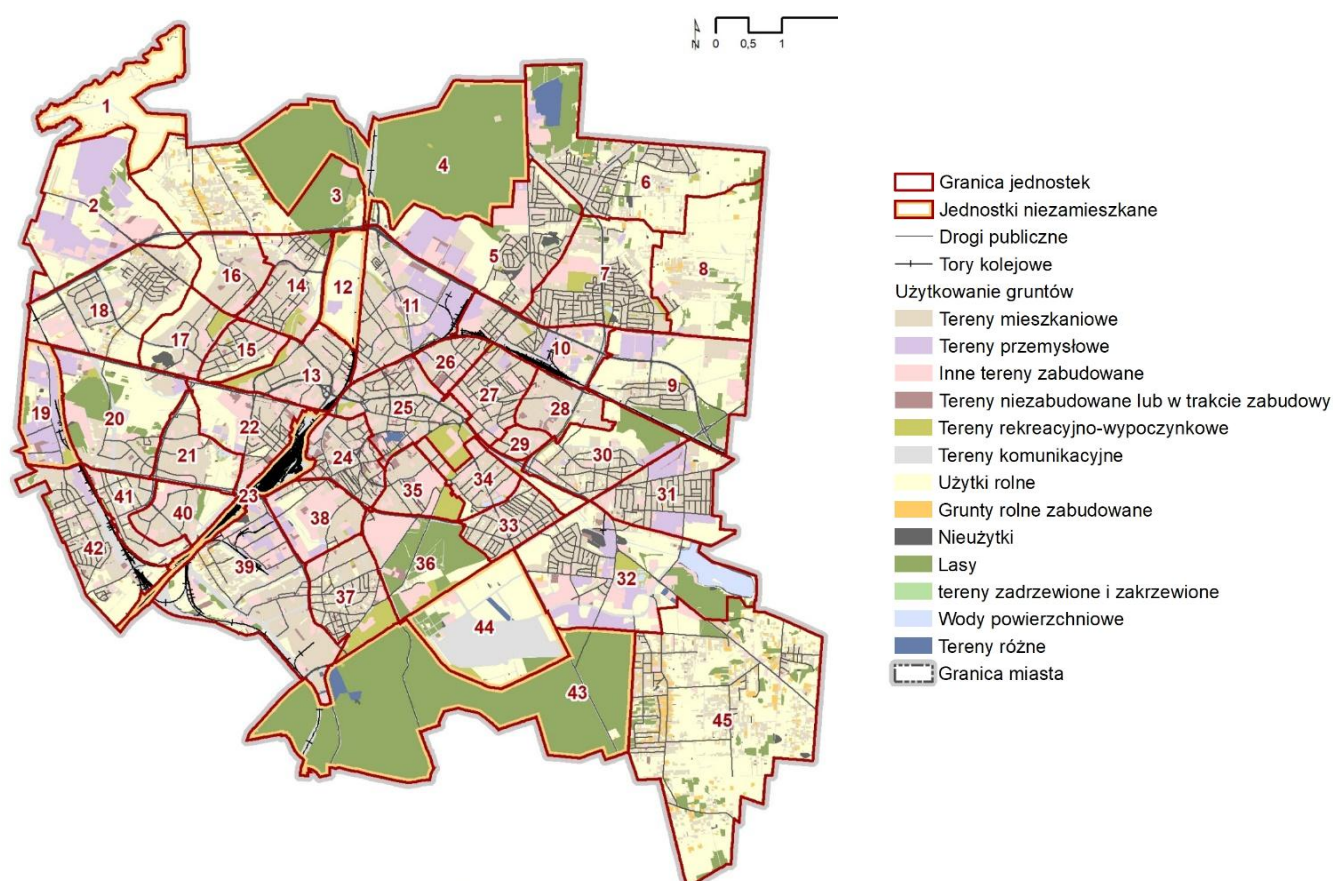

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku

2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Według definicji ustawowej **obszar zdegradowany** jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:


- gospodarczych,
- środowiskowych,
- przestrzenno-funkcjonalnych,
- technicznych.

Miasto przebadano pod kątem zjawisk kryzysowych w sferze społecznej (22 wskaźniki), gospodarczej (6 wskaźników), przestrzenno-funkcjonalnej (8 wskaźników), technicznej (5 wskaźników) i środowiskowej (4 wskaźniki). Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego przyjęto obszary gdzie występuje:

- co najmniej 14 negatywnych zjawisk ze sfery społecznej,
- co najmniej po jednym negatywnym zjawisku w każdej z czterech pozostałych sfer.

W wyniku analizy wyznaczono obszar zdegradowany, złożony z 5 jednostek.

Rysunek 2. Obszar zdegradowany

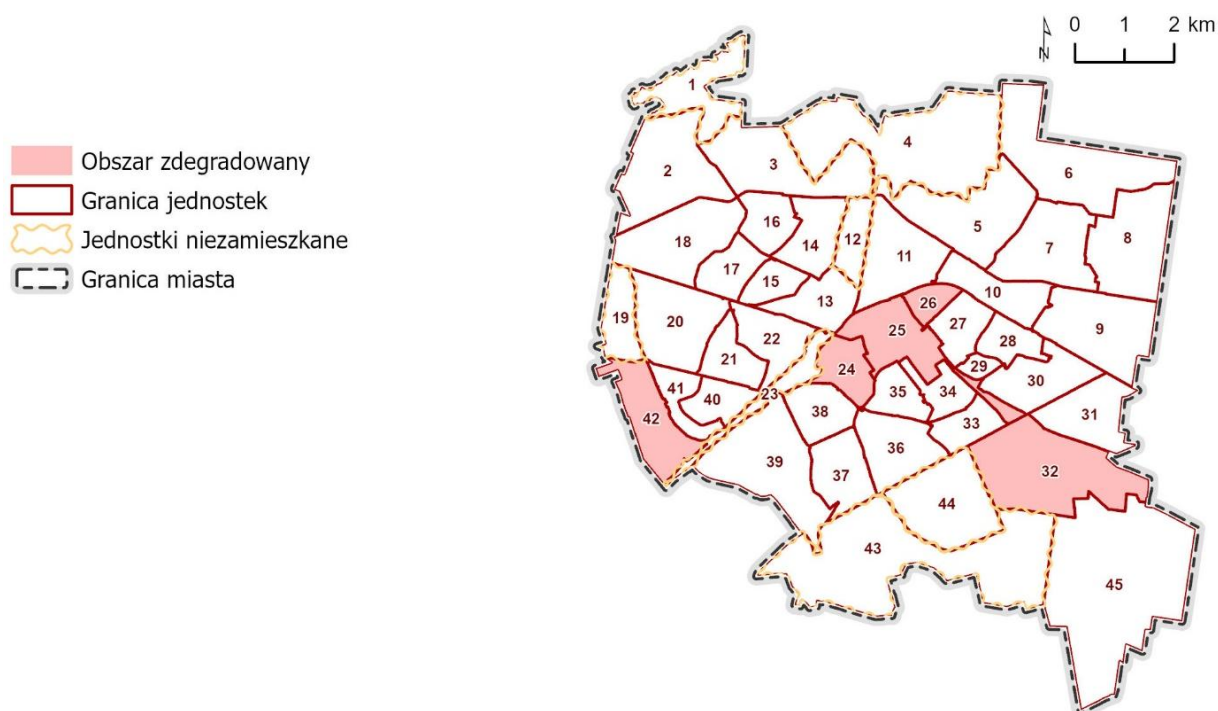


Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku

Obszar rewitalizacji:

- obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić *rewitalizację*;
- nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy;
- może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

W Białymstoku obszar rewitalizacji, pokrywający się z obszarem zdegradowanym, obejmuje 2 podobszary: Centrum i Dojlidy oraz Starosielce. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 1071,5 ha (10,5% powierzchni miasta) i w momencie jego wyznaczenia zamieszkiwany był przez 34 989 osób (12,8% populacji miasta).

Rysunek 3. Granice obszaru rewitalizacji w Białymstoku

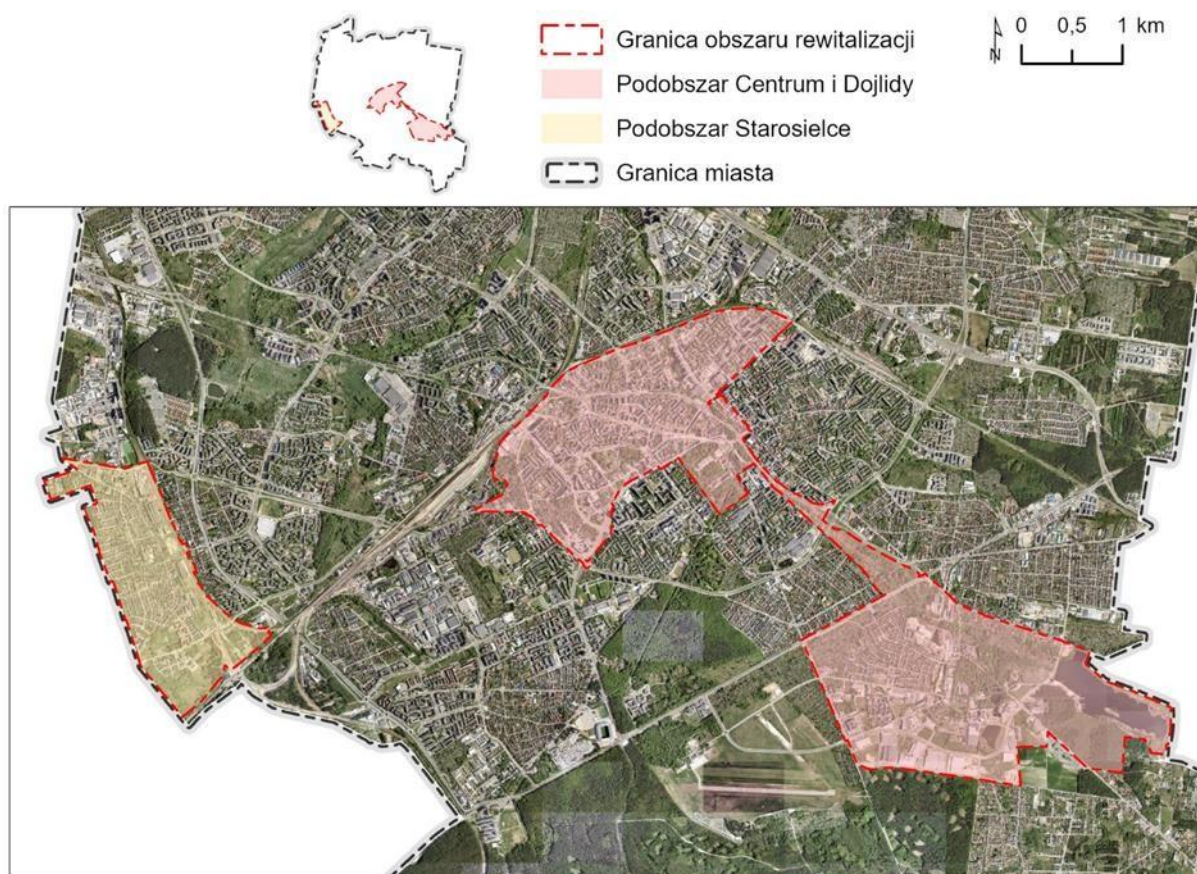

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Wyznaczony w wyniku diagnozy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Białystok uchwałą Nr LXXIV/1019/23 w dniu 18 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 poz. 4868).

2.3. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 został przyjęty uchwałą Nr III/20/24 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r. W dokumencie sformułowano trzy dopełniające się cele, które jednocześnie odnoszą się do zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji, a także uwzględniają potrzeby jego mieszkańców. Do każdego celu zostały przyporządkowane odpowiednie kierunki działań.

Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji

- K.1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji
- K.1.2. Działania wychowawczo-edukacyjne w celu aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym młodzieży, z obszaru rewitalizacji
- K.1.3. Modernizacja miejskiego zasobu lokalowego dla zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji

Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji

- K.2.1. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji
- K.2.2. Kontynuacja działań na rzecz rozwoju mobilności na obszarze rewitalizacji
- K.2.3. Kompleksowa odnowa infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji

Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji

- K.3.1. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji
- K.3.2. Intensyfikacja działań na rzecz ochrony przyrody realizowanych z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji

2.4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Zaplanowana kompleksowa interwencja w formie przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających konsekwentnie i sukcesywnie wdrażana będzie prowadziła do zlikwidowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034, zawiera 30 przedsięwzięć podstawowych (P) i 13 uzupełniających (U). Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały ujęte na liście projektów podstawowych, spełniają warunek poprawy dostępności w stosunku do osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Horyzont czasowy realizacji projektów wskazano na lata 2024-2034, co umożliwi ich realizację w okresie obowiązywania GPR.

Każdy projekt posiada swojego realizatora, który odpowiedzialny jest za deklaracje dotyczące sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do wykorzystania źródeł finansowania jest każdorazowo przypisywana poszczególnym realizatorom projektów.

W zakresie wartości przedsięwzięć oraz typu ich finansowania zapisy GPR nie definiują ostatecznie rodzaju i źródła finansowania, ponieważ będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę na etapie dokumentacji technicznej oraz analiz finansowych, wykonywanych na potrzeby aplikowania o zewnętrzne granty.

Tabela 1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe a cele Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Nazwa przedsięwzięcia	Obszar
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	
P1. Projekt „Bezpieczna rodzina” skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P2. Dzieci, młodzież, rodzina – aktywizacja społeczności obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P3. Osiedlowy klub integracji społecznej na obszarze rewitalizacji	Starosielce
P4. Organizacja pikników ekologicznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P5. Organizacja zajęć edukacyjnych związanych z biologią płazów w białostockich placówkach oświatowych dla uczniów i mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P6. Organizacja zajęć edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P7. Funkcjonalna Włókiennicza 7 – modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizowanych	Centrum i Dojlidy z włączeniem mieszkańców podobszaru Starosielce
P8. Pracownie dla artystów, mieszkania komunalne	Centrum i Dojlidy
P9. Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji przez przebudowę budynku o funkcji usługowej	Centrum i Dojlidy
P10. Zwiększenie dostępności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przez wymianę urządzenia dźwigowego	Centrum i Dojlidy
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	
P11. Modernizacja zabytkowych przestrzeni obszaru rewitalizacji (Parku Planty i Bulwarów Kościłkowskiego oraz ogrodu zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich)	Centrum i Dojlidy
P12. Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+” w Białymstoku na obszarze rewitalizacji	Centrum i Dojlidy
P13. Modernizacja zabytkowego budynku i jego adaptacja na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich	Centrum i Dojlidy
P14. Zwiększenie oferty kulturalnej obszaru rewitalizacji przez przebudowę budynku na potrzeby Muzeum Wojska	Poza obszarem rewitalizacji – teren przylegający bezpośrednio do podobszaru Centrum i Dojlidy
P15. Zwiększenie oferty społecznej na obszarze rewitalizacji przez przebudowę budynku	Centrum i Dojlidy

Nazwa przedsięwzięcia	Obszar
P16. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku w celu poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	Starosielce
P17. Poprawa jakości i uspołnienie infrastruktury dla rowerów na obszarze rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz poza obszarem rewitalizacji
P18. Ograniczenie ruchu komunikacji indywidualnej na obszarze rewitalizacji – budowa woonerfu w ul. św. Rocha w Białymstoku	Centrum i Dojlidy
P19. Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	Centrum i Dojlidy
P20. Przebudowa i modernizacja zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w celu ochrony obiektów zabytkowych	Poza obszarem rewitalizacji: ul. Warszawska 8
P21. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Centrum i Dojlidy
P22. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizacji	Starosielce oraz Centrum i Dojlidy
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji	
P23. Częściowa renaturyzacja rzeki Białej wraz z zagospodarowaniem bulwarów nadrzecznych	Centrum i Dojlidy
P24. Rewaloryzacja parku Branickich w zakresie boskietów, rekonstrukcji ogrodu chińskiego wraz z Pawilonem Chińskim oraz Ogrodu Dolnego w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy
P25. Rewaloryzacja zabytkowego parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy
P26. Budowa parków kieszonkowych na obszarze rewitalizacji	Starosielce
P27. Zakładanie łąk kwietnych na obszarze rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce
P28. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji przez realizację projektu edukacyjnego pn. „Drugie życie drzew”	Centrum i Dojlidy
P29. Akcja czynnej ochrony płazów w celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy
P30. Realizacja projektu edukacyjnego pn. „Czysty Białystok” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Centrum i Dojlidy oraz Starosielce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Tabela 2. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające a cele Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Nazwa przedsięwzięcia
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji
U1. Klub seniora na obszarze rewitalizacji
U2. Miejsce aktywności mieszkańców (MAM) – Centrum
U3. Przebudowa budynku przy ul. Branickiego w celu ochrony obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na cele społeczne
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
U4. Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji i dostępności przez przebudowę nawierzchni Miejskiego Targowiska
U5. Zwiększenie dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych
U6. Przebudowa Akcentu ZOO w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
U7. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez przeprowadzenie termomodernizacji obiektów oświatowych służących mieszkańcom obszaru rewitalizacji
U8. Adaptacja budynku starej elektrowni wraz z otoczeniem na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku
U9. BTL – Przestrzeń Kreatywna Modernizacja patio i zaplecza sceny kameralnej Białostockiego Teatru Lalek
U10. BTL – Przestrzeń Kreatywna Modernizacja magazynu Białostockiego Teatru Lalek
U11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji
U12. Rewitalizacja terenów zieleni na osiedlu Bema
U13. Modernizacja zabytkowego parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Tabela 3. Szacunkowe ramy finansowe GPRB z podziałem na źródła finansowania (zł)

Rodzaj przedsięwzięć	Szacunkowa wartość przedsięwzięć	Wkład własny finansowany ze środków prywatnych	Wkład własny finansowany ze środków publicznych	Dofinansowanie w ramach środków krajowych	Dofinansowanie pochodzące z funduszy i programów UE
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji					
Przedsięwzięcia podstawowe	52 500 000	0	27 127 500	0	25 372 500
Przedsięwzięcia uzupełniające	20 840 000	66 000	3 400 000	0	17 374 000
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji					
Przedsięwzięcia podstawowe	301 032 000	0	84 500 300	104 840 000	111 691 700
Przedsięwzięcia uzupełniające	47 860 000	0	10 885 000	0	36 975 000
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji					
Przedsięwzięcia podstawowe	184 050 000	0	27 862 500	0	156 187 500
Przedsięwzięcia uzupełniające	26 730 000	0	13 980 000	0	12 750 000
Razem					
Przedsięwzięcia podstawowe i uzupełniające Cel 1-3	633 012 000	66 000	167 755 300	104 840 000	360 350 700


Źródło: Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Wykres 1. Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających GPRB z podziałem na źródła finansowania (w %)

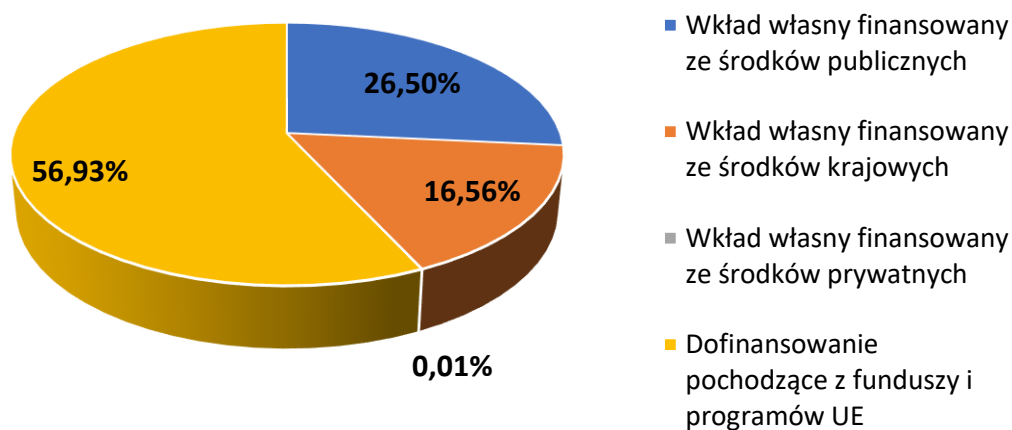

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Wykres 2. Podział przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających według dominującej sfery

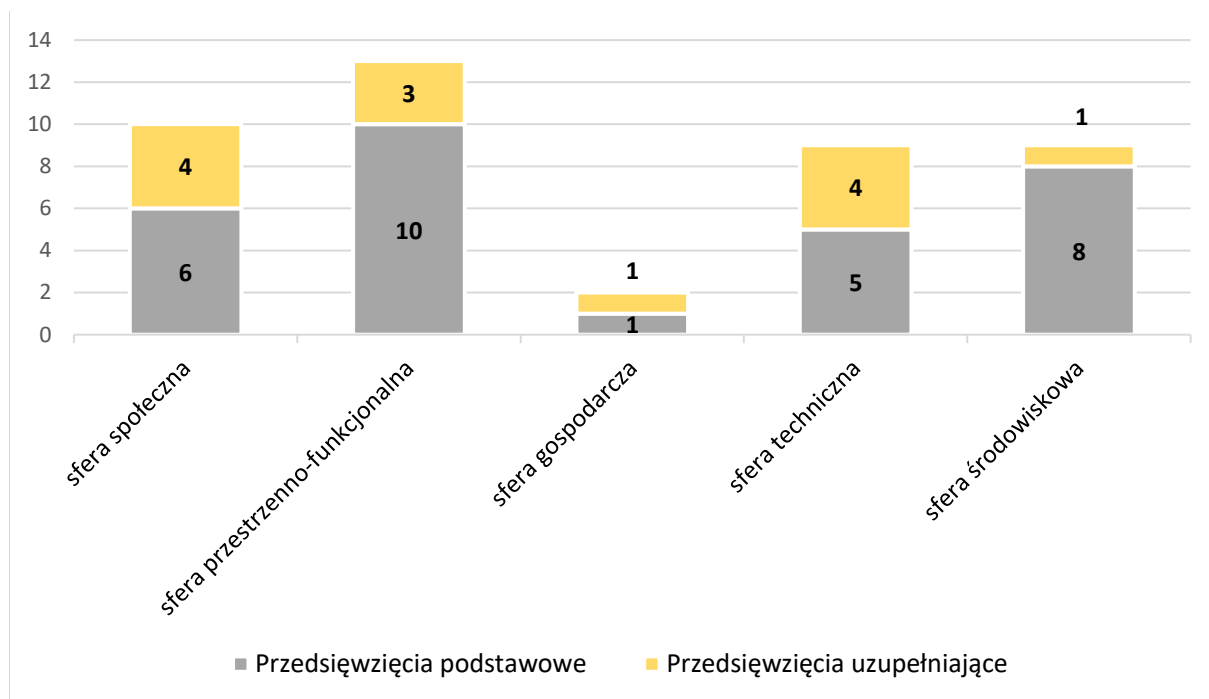

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Tabela 4. Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających według dominującej sfery (w zł)

Wyszczególnienie	Społeczna	Przestrzenno-funkcjonalna	Gospodarcza	Techniczna	Środowiskowa	Suma
Przedsięwzięcia podstawowe	27 770 000	242 452 000	5 770 000	77 540 000	184 050 000	537 582 000
Przedsięwzięcia uzupełniające	21 840 000	15 360 000	4 000 000	42 500 000	11 730 000	95 430 000
Suma	49 610 000	257 812 000	9 770 000	120 040 000	195 780 000	633 012 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

3. System monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

3.1. Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Monitoring realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w „Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024 -2034” obejmuje okres od czasu uchwalenia dokumentu do dnia 31.12.2024 r. W procesie sprawozdawczym przedsięwzięć kontrolowane są zarówno wydatki ponoszone na realizację przedsięwzięć, jak również zakres wykonanych działań oraz stopień realizacji wskaźników. Informacje dotyczące stanu faktycznego zaplanowanych w GPRB przedsięwzięć, przekazywane są przez realizatorów projektów.

Tabela 5. Stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji					
P1	Projekt „Bezpieczna rodzina” skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	W 2025 r. planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert, zawarcie umowy i realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2025-2026.
P2	Dzieci, młodzież, rodzina – aktywizacja społeczności obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P3	Osiedlowy klub integracji społecznej na obszarze rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	157 800,00 zł (budżet gminy)	W 2024 roku klub aktywności międzypokoleniowej „Aktywne Starosielce” na osiedlu Starosielce działał przez 30 godzin tygodniowo, w tym dwa dni popołudniowo oraz minimum dwa razy w miesiącu w weekendy. W ramach oferty odbywało się średnio 6 warsztatów/kursów miesięcznie, obejmujących m.in. rękodzieło, pierwszą pomoc, ekorecykling, szycie, haftowanie, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo w sieci, szydełkowanie, warsztaty kulinarne, kurs tańca dla różnych grup wiekowych, zajęcia muzyczne dla dzieci i zajęcia teatralne. Regularnie organizowano także 3 cykliczne zajęcia sportowe. Ponadto, odbyło się 8 wydarzeń integracyjnych oraz 11 spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym ze specjalistami z zakresu onkologii czy	Dalsza aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych osiedla Starosielce, stworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności mieszkańców, organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych oraz zajęć cyklicznych.

				ratownictwa. Ważnym elementem działalności były działania międzypokoleniowe, takie jak kino w klubie, międzypokoleniowe kibicowanie, wyjścia na mecze, punkt wymiany książek oraz wycieczki. Uczestnicy aktywnie angażowali się w akcje charytatywne, a klub podpisał 6 porozumień o współpracy, m.in. ze Szkołą Podstawową oraz grupą Ratowniczą Nadzieja. Oprócz standardowych zajęć, realizowane były również inicjatywy nieokreślone w GPRB, takie jak wspólne granie w gry, pomoc w nauce, bezpieczne chustowanie czy zajęcia sensoryczne dla dzieci.	
P4	Organizacja pikników ekologicznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	41 250,00 zł (budżet gminy)	W 2024 roku odbyły się trzy Pikniki Ekologiczno-Integracyjne: 2 w Parku Planty (w kwietniu związany z akcją Czysty Białystok oraz we wrześniu, będący podsumowaniem Akcji zbiórki baterii) i 1 w Parku Konstytucji 3 Maja (w czerwcu związany z Akcją Drugie Życie Drzew).	W kolejnym roku sprawozdawczym planowane do realizacji są dwa pikniki (w kwietniu i we wrześniu).

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P5	Organizacja zajęć edukacyjnych związanych z biologią płazów w białostockich placówkach oświatowych dla uczniów i mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	bezkosztowo	W 2024 roku w białostockich szkołach zrealizowano 23 bezpłatne zajęcia edukacyjne z zakresu biologii i ekologii płazów, mające na celu propagowanie idei ochrony przyrody. Lekcje prowadzone przez pracowników Urzędu spotkały się z dużym zainteresowaniem, przybliżając uczniom mało znane zwierzęta w sposób ciekawy i przystępny. Zajęcia miały szczególne znaczenie edukacyjne, biorąc pod uwagę drastyczny spadek liczebności płazów, zwłaszcza w miastach. Działania te zwiększają świadomość ekologiczną i angażują mieszkańców w ochronę przyrody.	Organizacja kolejnych zajęć edukacyjnych w podobnym wymiarze co w 2024 r.
P6	Organizacja zajęć edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	6 539,21 zł (budżet gminy)	Biuro Gospodarowania Odpadami zrealizowało zaplanowane zajęcia i spotkania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.	W kolejnym roku sprawozdawczym będą realizowane zajęcia edukacyjne w kolejnych grupach i klasach zgłoszonych przez placówki oświatowe.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P7	Funkcjonalna Włókiennicza 7 – modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizowanych	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
P8	Pracownie dla artystów, mieszkania komunalne	Projekt jest w trakcie realizacji.	1 938 808,58 zł (budżet gminy)	Zakończono przebudowę budynku przy ul. Suchowolca 25D oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynków mieszczących się na ul. Suchowolca 25E i 25G.	W roku 2025r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budynków nr 25 i 25A oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie budynków nr 25B i 25C.
P9	Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji przez przebudowę budynku o funkcji usługowej	Projekt jest w trakcie realizacji.	21 525,00 zł (budżet gminy)	Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Kijowskiej 3.	W roku 2025r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy budynku.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P10	Zwiększenie dostępności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przez wymianę urządzenia dźwigowego	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	W roku 2025r. planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wymiany urządzenia dźwigowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Malmeda Icchoka 8.
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji					
P11	Modernizacja zabytkowych przestrzeni obszaru rewitalizacji (Parku Planty i Bulwarów Kościątkowskiego oraz ogrodu zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich)	Projekt jest w trakcie realizacji.	8 740 108,20 zł, (w tym: planowane sfinansowanie wydatków z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 1 904 470,28 zł, budżet gminy- 6 835 637,92 zł)	Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe przy rewaloryzacji Parku Planty i Bulwarów Kościątkowskiego oraz budowę placu zabaw. Zakończono modernizację części ogrodu zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę fontanny w Parku Planty.	Kontynuacja robót budowlano-montażowych przy rewaloryzacji Parku Planty i Bulwarów Kościątkowskiego. Zakończenie budowy placu zabaw w Parku Planty. Rozpoczęcie robót związanych z budową fontanny w Parku Planty oraz kolejnego etapu modernizacji ogrodu zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P12	Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+” w Białymstoku na obszarze rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
P13	Modernizacja zabytkowego budynku i jego adaptacja na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich	Projekt jest w trakcie realizacji.	1 262 746 zł (budżet gminy)	Wykonano remont dachu budynku oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną.	Planowane dokończenie wymiany stolarki okiennej i wymianę stolarki drzwiowej.
P14	Zwiększenie oferty kulturalnej obszaru rewitalizacji przez przebudowę budynku na potrzeby Muzeum Wojska	Projekt jest w trakcie realizacji.	66 433,88 zł (budżet gminy)	Rozpoczęto kompleksowe roboty w zakresie przebudowy części budynku przy ul. Węglowej na potrzeby Muzeum Wojska.	W roku 2025r. planowana jest kontynuacja prowadzonych robót budowlanych.
P15	Zwiększenie oferty społecznej na obszarze rewitalizacji przez przebudowę budynku	Projekt jest w trakcie realizacji.	652 922 zł (budżet gminy)	Zakończono opracowanie dokumentacji w zakresie kompleksowego remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Ks. Suchowolca 6.	W roku 2025r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku i rozpoczęcie kompleksowych robót budowlanych.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P16	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku w celu poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	2 112 092,98 zł (w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja VIII - 1 968 893,08 zł, budżet gminy – 143 199,90 zł)	Inwestycja realizowana jest w trzech etapach: – Etap 1: ul. Letnia, Klonowa, Zimowa; – Etap 2: ul. Korycińska; – Etap 3: ul. Niewodnicka. Etap 1 - uzyskano nieprawomocne pozwolenie na budowę ul. Zimowej oraz przebudowę ul. Letniej, Zimowej i Klonowej. Etap 2 - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą zewnętrzną i przekazano plac budowy. Etap 3 - inwestycja została zrealizowana (wykonano nawierzchnię jezdni z ciągami pieszymi, wloty dróg bocznych wraz z sięgaczami łączącymi sąsiadujące ulice, wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz zostały przebudowane kolizje z infrastrukturą podziemną).	Etap 1 - W 2025 r. planowane jest uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz ich rozpoczęcie. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2026. Etap 2- W 2025 r. planowana jest budowa i przebudowa infrastruktury technicznej.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P17	Poprawa jakości i uspołnienie infrastruktury dla rowerów na obszarze rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	0,00 zł	Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku. Dodatkowo, zawarto umowy na budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic: Zwycięstwa, Kolejowej, Knyszyńskiej, Legionowej – placu Jana Pawła II – rondo dr Lussy, Jana Klemensa Branickiego, Piastowskiej, a także na budowę przejazdu rowerowego przez Al. Józefa Piłsudskiego.	W 2025 r. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane: – powiązanie drogi dla rowerów w ulicach: Zwycięstwa, Kolejowej, Knyszyńskiej; – droga rowerowa w ciągu ulic Branickiego, Piastowska.
P18	Ograniczenie ruchu komunikacji indywidualnej na obszarze rewitalizacji – budowa woonerfu w ul. św. Rocha w Białymstoku	Projekt jest w trakcie realizacji.	0,00 zł	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z usługami towarzyszącymi. Postępowanie zostało unieważnione – jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.	Ponowne ogłoszenie postępowania.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P19	Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	Projekt jest w trakcie realizacji.	822 589,25 zł (w tym: planowane sfinansowanie wydatków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2024 – 548 800,00 zł, budżet gminy – 273 789,25 zł)	Wykonano renowację boisk przy Zespole Szkół Rolniczych. Opracowano dokumentację projektową budowy sal gimnastycznych przy trzech placówkach (SP Nr 28, Zespół Szkół Mechanicznych i VII LO). W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 4 oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Technicznych.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 4 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Technicznych. Rozpoczęcie robót w zakresie budowy Sali gimnastycznej przy SP Nr 28 i budowy boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych (w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego).
P20	Przebudowa i modernizacja zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w celu ochrony obiektów zabytkowych	Projekt jest w trakcie realizacji.	999 999,14 zł (budżet gminy)	Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe w zakresie II i III etapu modernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego.	Kontynuacja robót budowlano-montażowych.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P21	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Projekt jest w trakcie realizacji.	11 070,00 zł (budżet gminy)	Opracowano audyty energetyczne budynków przy ul. Dojnowskiej 80A i 80B i zlecono opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej powyższych budynków.	W roku 2025r. planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowych.
P22	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	W 2025 r. planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Portugalskiej i Szwajcarskiej. Planowane zakończenie prac marzec 2027 r.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji					
P23	Częściowa renaturyzacja rzeki Białej wraz z zagospodarowaniem bulwarów nadrzecznych	Projekt jest w trakcie realizacji.	0,00 zł	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia nadzoru autorskiego nad realizacją I etapu bulwarów. Oba postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert	Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe w zakresie I etapu.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P24	Rewaloryzacja parku Branickich w zakresie boskietów, rekonstrukcji ogrodu chińskiego wraz z Pawilonem Chińskim oraz Ogrodu Dolnego w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----
P25	Rewaloryzacja zabytkowego parku Lubomirskich w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----
P26	Budowa parków kieszonkowych na obszarze rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P27	Zakładanie łąk kwietnych na obszarze rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	256 100,07 zł (budżet gminy)	Przedsięwzięcie objęło założenie łąk kwietnych jednorocznych i bylinowych na powierzchni ok. 10 ha. Były one zlokalizowane w pasach drogowych i na działkach należących do miasta Białystok. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane roboty związane z przygotowaniem podłoża pod łąki, założenie łąk oraz ich pielęgnacja.	Kontynuacja projektu.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P28	Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji przez realizację projektu edukacyjnego pn. „Drugie życie drzew”	Projekt jest w trakcie realizacji.	20 000,00 zł (budżet gminy)	Zlecono inwentaryzację przyrodniczą zespołu kłód w ramach projektu „Drugie życie drzew” wraz z przygotowaniem sprawozdania i dokumentacji fotograficznej. Kłody drzew w parkach stały się naturalnym miejscem zabaw dla dzieci i estetycznym uzupełnieniem przestrzeni miejskiej, która znakomicie komponuje się z otaczającą zielenią. Na każdej kłodzie umieszczona jest tabliczka informacyjna, dzięki której mieszkańcy obszaru rewitalizacji dowiadują się o gatunku drzewa i programie „Drugie życie drzew”. W 2024 r. oznaczono 30 kłód w 4 parkach: Centralnym, Antoniuk, Lubomirskich i Konstytucji 3 Maja.	Kontynuacja projektu.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu w 2024 r.	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
P29	Akcja czynnej ochrony płazów w celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	26 485,00 zł (budżet gminy)	W ramach wiosennej akcji czynnej ochrony płazów uratowano i przeniesiono w bezpieczne miejsca 603 sztuk płazów reprezentujących siedem gatunków.	Kontynuacja projektu.
P30	Realizacja projektu edukacyjnego pn. „Czysty Białystok” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	22 845,44 zł (budżet gminy)	Przeprowadzono Akcję „Czysty Białystok” w, której wzięło udział 11 tys. osób podzielonych na 118 grup m.in. grupy z przedszkoli, szkół, ochotnicy z osiedli oraz białostockich firm. Przed rozpoczęciem wydarzenia zostały zorganizowane warsztaty edukacji ekologicznej dla liderów grup, na których przedstawiono system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasady obowiązujące podczas sprzątania. W kwietniu 2024 roku odbył się Piknik Ekologiczno-Integracyjny w Parku Planty.	Przygotowania i przeprowadzenie Akcji Czysty Białystok 2025.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 6. Stan realizacji uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji					
U1	Klub seniora na obszarze rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----
U2	Miejsce aktywności mieszkańców (MAM) – Centrum	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----
U3	Przebudowa budynku przy ul. Branickiego w celu ochrony obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na cele społeczne	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji					
U4	Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji i dostępności przez przebudowę nawierzchni Miejskiego Targowiska	Projekt jest w trakcie realizacji.	209 429,70 zł (budżet gminy)	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej z zakresem przebudowy części nawierzchni na terenie Targowiska z budową parkingów.	W roku 2025 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
U5	Zwiększenie dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt jest w trakcie realizacji.	19 000,00 zł (budżet gminy)	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy schodów i budowy platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 (Filia nr 12 Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego).	W roku 2025 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
U6	Przebudowa Akcentu ZOO w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	-----
U7	Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez przeprowadzenie termomodernizacji obiektów oświatowych służących mieszkańcom obszaru rewitalizacji	Projekt jest w trakcie realizacji.	291 209,02 zł (budżet gminy)	Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne w Zespole Szkół Nr 16 oraz ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Zwycięstwa 28.	Kontynuacja robót w Zespole Szkół Nr 16. Zakończenie realizacji w zakresie prac termomodernizacyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
U8	Adaptacja budynku starej elektrowni wraz z otoczeniem na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku	Projekt jest w trakcie realizacji.	897 039,00 zł (budżet gminy)	Odwilgocono elewację frontową budynku, przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonano zejście do piwnicy. Wykonano dodatkowe wyjście z budynku.	Planowana jest budowa oddzielnego węzła ciepłowniczego
U9	BTL – Przestrzeń Kreatywna Modernizacja patio i zaplecza sceny kameralnej Białostockiego Teatru Lalek	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Wykonanie tego zadania przesunięto na lata 2027-2029.
U10	BTL – Przestrzeń Kreatywna Modernizacja magazynu Białostockiego Teatru Lalek	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Aktualizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej, przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac rozbiórkowych i budowlanych.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Status przedsięwzięcia	Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Zrealizowany zakres rzeczowy w okresie sprawozdawczym	Opis działań zaplanowanych na kolejny rok sprawozdawczy/ dodatkowe informacje
U11	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze rewitalizacji poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego	Projekt jest w trakcie realizacji.	0,00 zł	Zawarto umowę na dostawę i montaż kamer sieciowych w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku.	Realizacja umowy zawartej w 2024 roku.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji					
U12	Rewitalizacja terenów zieleni na osiedlu Bema	Projekt jest w trakcie realizacji.	354 327,33 zł (budżet gminy)	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji terenów zielonych na osiedlu Bema i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie IV strefy z rewitalizacji stawu na osiedlu Bema.	W roku 2025r. planowane jest zakończenie robót w zakresie strefy IV oraz rozpoczęcie robót w zakresie strefy I (z miejscem wypoczynkowym i miejscem wyprowadzania zwierząt).
U13	Modernizacja zabytkowego parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji	Projekt nierozpoczęty.	-----	-----	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Termin zakończenia prac projektowych: II kwartał 2026 roku.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 7. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

Wyszczególnienie	Zakończone	W trakcie realizacji	Nierozpoczęte	Rezygnacja z realizacji	Suma
Przedsięwzięcia podstawowe	0	21	9	0	30
Przedsięwzięcia uzupełniające	0	6	7	0	13
Suma	0	27	16	0	43

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3. Podział realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych według dominującej sfery

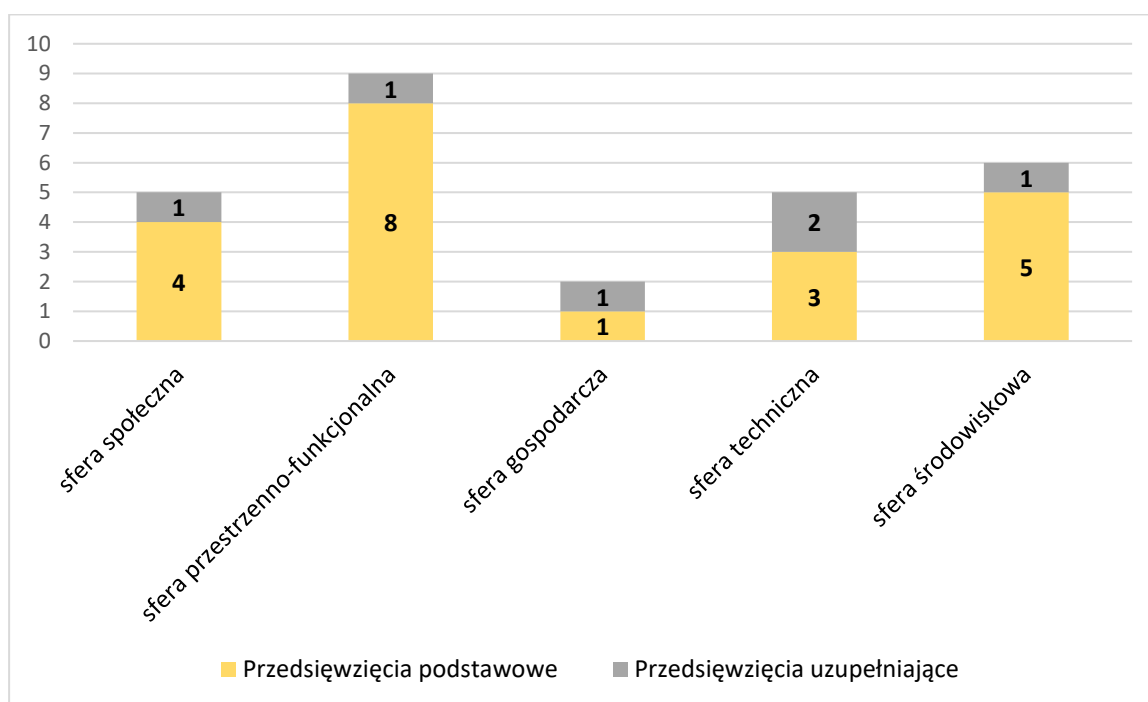

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8. Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2024 r. według sfer

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2024 r.					Suma
	Społeczna	Przestrzenno-funkcjonalna	Gospodarcza	Techniczna	Środowiskowa	
Przedsięwzięcia podstawowe	205 589,21	13 656 892,31	21 525,00	2 949 877,72	325 430,51	17 159 314,75
Przedsięwzięcia uzupełniające	0,00	19 000,00	209 429,70	1 188 248,02	354 327,33	1 771 005,05
Suma	205 589,21	13 675 892,31	230 954,70	4 138 125,74	679 757,84	18 930 319,80

Źródło: Opracowanie własne

W 2024 roku rozpoczęto realizację 27 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 21 podstawowych. Dominowały projekty realizowane w **sferze przestrzenno-funkcjonalnej**. Największe nakłady poniesiono na realizację następujących projektów:

- **P11** - *Modernizacja zabytkowych przestrzeni obszaru rewitalizacji (Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego oraz ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich)* – zakończono modernizację części ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich; rozpoczęto roboty budowlano-montażowe przy rewaloryzacji Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego, a także uzyskano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę fontanny w Parku Planty (ok. 8,7 mln zł),
- **P16** - *Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku w celu poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji* – inwestycja realizowana w 3 etapach: 1 – uzyskano nieprawomocne pozwolenie na budowę (ul. Letnia, Klonowa, Zimowa), 2 – podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy (ul. Korycińska), 3 – zrealizowano inwestycję (ul. Niewodnicka) (wartość realizacji 3 etapów – ok. 2,1 mln zł),
- **P13** - *Modernizacja zabytkowego budynku i jego adaptacja na potrzeby Galerii im. Słędzińskich* (ok. 1,3 mln zł).

Wartość podjętych w 2024 r. działań realizowanych w zakresie powyższych projektów wyniosła ok. 12,1 mln zł i stanowiła większość środków poniesionych w sferze przestrzenno – funkcjonalnej w analizowanym roku sprawozdawczym.

Ponadto w 2024 roku w trakcie realizacji było po pięć projektów rewitalizacyjnych w każdej ze sfer: społecznej, technicznej i środowiskowej.

- w **sferze społecznej** realizowano m.in. następujące projekty:
 - **P3** - *Osiedlowy klub integracji na obszarze rewitalizacji* – klub aktywności międzypokoleniowej „Aktywne Starosielce” działał przez 30 h tygodniowo, w ramach oferty odbywały się m.in.: warsztaty/kursy (średnio 6 miesięcznie), cykliczne zajęcia sportowe (3), wydarzenia integracyjne (8), spotkania z ciekawymi ludźmi (11) (ok. 160 tys. zł),
 - **P4** - *Organizacja pikników ekologicznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji* – w 2024 r. odbyły się 3 Pikniki Ekologiczno-Integracyjne (ok. 40 tys. zł).
- w **sferze technicznej** realizowano m.in. następujące projekty:
 - **P8** - *Pracownie dla artystów, mieszkania komunalne* – zakończono przebudowę budynku przy ul. Suchowolca 25D oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynków przy ul. Suchowolca 25E i 25G (ok. 2 mln zł),
 - **P20** - *Przebudowa i modernizacja zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego w celu ochrony obiektów zabytkowych* (ok. 1 mln zł),
 - **U8** - *Adaptacja budynku starej elektrowni wraz z otoczeniem na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku* (ok. 900 tys. zł).

W przypadku **sfer środowiskowej** oprócz realizacji projektu **U12** - *Rewitalizacja terenów zieleni na osiedlu Bema* (ok. 350 tys. zł), realizowano miejskie projekty takie jak m.in.:

- **P27** - *Zakładanie tąg kwiatnych na obszarze rewitalizacji* (ok. 260 tys. zł),

- **P28** - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji przez realizację projektu edukacyjnego pn. „Drugie życie drzew” (ok. 20 tys. zł),
- **P29** - Akcja czynnej ochrony pławów w celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji (ok. 27 tys. zł),
- **P30** - Realizacja projektu edukacyjnego pn. „Czysty Białystok” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (ok. 23 tys. zł).

Ponadto w 2024 r. realizowano 2 projekty w sferze gospodarczej: **U4** - Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji i dostępności przez przebudowę nawierzchni Miejskiego Targowiska (ok. 210 tys. zł) oraz **P9** - Zwiększenie potencjału gospodarczego na obszarze rewitalizacji przez przebudowę budynku o funkcji usługowej (ok. 20 tys. zł).

3.2. Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wskaźniki są podstawowym narzędziem do monitorowania postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które dostarczają informacji dotyczących produktów lub rezultatów. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały określone w opisach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępnych w GPRB. Do monitorowania całościowych postępów w realizacji przedsięwzięć wybrano najbardziej typowe wskaźniki, powiązane ze specyfiką i charakterem powiązanych z nimi celów.

Za osiągnięcie produktów i rezultatów poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialni są ich realizatorzy, czego potwierdzenie następuje poprzez przekazanie informacji za pośrednictwem formularza do ich monitorowania. Natomiast w raporcie corocznym ujmowane są wybrane wskaźniki, za pomocą których następuje częściowa ocena realizacji celów strategicznych GPRB.

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki wybrane do częściowej oceny (rocznej) stopnia realizacji celów GPRB w odniesieniu do bezpośrednich rezultatów osiągniętych w efekcie wdrażania przedsięwzięć.

Tabela 9. Wskaźniki monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Wskaźniki monitorujące (powiązane z FEdP 2021-2027)	Rodzaj wskaźnika	Poziom w roku bazowym (2024)	Poziom w roku docelowym (2034)
Cel 1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji			
Liczba przedsięwzięć [szt.]		6	10
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	Wskaźnik produktu	0	2
Całkowita liczba osób objętych wsparciem [os.]	Wskaźnik produktu	5 397	3 070
Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu [os.]	Wskaźnik rezultatu	494	850
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [os.]	Wskaźnik produktu	921	6 537
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	Wskaźnik produktu	1	9
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji			
Liczba przedsięwzięć [szt.]		10	12
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	Wskaźnik produktu	0	1
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	Wskaźnik produktu	0	11
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	Wskaźnik produktu	0	1
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	Wskaźnik produktu	0	14,0
Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [os.]	Wskaźnik rezultatu	0	34 989
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m ²]	Wskaźnik produktu	0	7 800,0
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	Wskaźnik produktu	0	2
Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji			
Liczba przedsięwzięć [szt.]		5	8
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	Wskaźnik produktu	0	861,0
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m ²]	Wskaźnik produktu	0	184 500,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli z Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034
